

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS AUDIENCIA FINAL 2020












**FEBRERO 2021** 





#### **CONTENIDO**

- MARCO NORMATIVO
- OBJETIVOS
- PROGRAMAS DE EMAGUA
- ESTADO DE PROYECTOS
- ESTADO FINANCIERO
- DESARROLLO COMUNITARIO
- CONCLUSIONES







#### MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Estado.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Ley No. 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
- Ley No. 341 de Participación y Control Social.
- Decreto Supremo No. 24894.
- Decreto Supremo No. 214.
- Resolución Ministerial No. 074/09 del Ministerio de Transparencia.
- Institucional y Lucha contra la Corrupción.







#### **OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS**

- a. Contar con una gestión pública transparente y libre de corrupción.
- b. Prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la sociedad civil, medios de comunicación y Organizaciones Sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y las bolivianas una cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción.
- c. Contar con instrumentos y metodologías orientados a la prevención, investigación, transparencia, acceso a la información y sanción de actos de corrupción







#### **PROYECTOS DE EMAGUA**

**24 PROGRAMAS** 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

69 PROYECTOS

PROYECTOS
CONCLUIDOS (EN
CIERRE,PARA
CIERRE
CERRADOS)

**263 PROYECTOS** 

PROYECTOS CON DIFICULTADES

28 PROYECTOS

**EN GESTION** 

11 PROYECTOS





#### PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA - PROAR

MONTO: US\$ 120.868.257,00

FINANCIAMIENTO: CORPORACION ANDINA DE

**FOMENTO - CAF** 

#### **PROYECTOS**

- EN EJECUCIÓN: 16 PROYECTOS

- CONCLUIDOS: 87 PROYECTOS

- CON DIFICULTAD: 2 PROYECTOS





# DEPARTAMENTO: COCHABAMBA PROYECTOS CON DIFICULTADES



**PROYECTO** 

CONST. PROYECTO
MULTIPLE SAN
MARTIN - SANTIVAÑEZ,
COCHABAMBA
(PROAR)

**DIFICULTADES** 

PARALIZADO POR FALTA DE APROBACION DE CONTRATO. MODIFICATORIO N°3, EL CUAL ESTA SUJETO A LA APROBACION DE LA ENMIENDA AL CIF. **ACCIONES** 

EMAGUA REMITIÓ LA
ENMIENDA AL CIF, AL GAD
Y AL GAM SANTIVAÑEZ,
LA CUAL SE ENCUENTRA
FIRMADA POR EL GAM
SANTIVAÑEZ, SE ESPERA
LA RATIFICACION DEL
CONSEJO DEL GAD DE
COCHABAMBA PARA
HACER EFECTIVA LA
ENMIENDA









#### **DEPARTAMENTO: ORURO**



#### PROYECTOS CON DIFICULTADES

**PROYECTO** 

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO INCA-PINTA-ORURO (PROAR) **DIFICULTADES** 

RECEPCION PROVISIONAL 25/01/19, LA ASOCIACION DE REGANTES DE VILLA POOPO IMPIDE VACIAR LA PRESA PARA REALIZAR PRUEBAS HIDRAULICAS, CORRECCION DE FILTRACIONES Y PROCEDER A LA RECEPCION DEFINITIVA.

**ACCIONES** 

SE REALIZARON
MULTIPLES REUNIONES
CON LOS
BENEFICIARIOS, EN LA
REUNON DEL 03/09/20
GAM VILLA POOPO
SEÑALO QUENO
PERMITIRA LA APRTURA
DE VAVULAS PARA
VACIAR LA REPRESA Y
REALIZRA LAS PRUEAS
NECESARIAS.













**MONTO: 141,5 MM US\$** 

Préstamo CAF: 61 MM US\$
Fuente OFID: 61 MM US\$

Contraparte: 19,5 MM US\$

**VIGENCIA A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN:** 

CAF: 27/01/2017, 15 años, periodo de gracia de 5 años OFID: 21/04/2017, 15 años, periodo de gracia de 5 años



#### PROYECTOS N° CFA 9759

- CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA: 15 PROYECTOS

- REMITIDO A EMAGUA: 9 PROYECTOS

- EN EJECUCIÓN : 4 PROYECTOS

- PARA FIRMA DE CONVENIO: 5 PROYECTOS



# PROGRAMA DE APOYO AL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO – ÁREAS RURALES - PASAR



**MONTO**: € 22.000.000.00 (Veintidós Millones de Euros)

FINANCIAMIENTO: UNION EUROPEA Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CIF N°93 VIGENCIA: 23 de enero de 2013 hasta el 23 de julio de 2019

#### PROYECTOS EN CIERRE

- 1. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA FÉ SEGUNDA FASE
- 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORINOCA FASE II
- 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE YUCUMO (FASE II).
- 4. SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE YUCUMO (FASE II)
- 5. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARIPOSAS FASE II COCHABAMBA (PASAR)
- 6. MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS NEGROS SANTA CRUZ (PASAR)
- 7. AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE VALLE IVIRZA SEGUNDA FASE COCHABAMBA (PASAR)



#### PROGRAMA LLALLAGUA



MONTO: Bs 51.451.864,57

FINANCIAMIENTO: MMAYA-UPRE/GAD POTOSI/GAM LLALLAGUA

**VIGENCIA CIF N°91: HASTA CIERRE TECNICO Y FINANCIERO** 

#### **PROYECTO**

1.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI) Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LLALLAGUA, SIGLO XX)







## PROGRAMA AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO (PACC I) FASE I

MONTO: EUR 12.000.000,00

**FINANCIAMIENTO: KFW, Frankurt am Main** 

VIGENCIA: 31 / diciembre / 2023

#### **PROYECTOS**



PROGRAMADOS: 13 PROY. PREINVERSIÓN

PRIORIZADOS: 6 PROY. COCHABAMBA

3 PROY. CHUQUISACA

CONCLUIDOS: 4 PROY. COCHABAMBA

- EJECUCIÓN : 1 PROY. COCHABAMBA

- PARALIZADO : 1 PROY. COCHABAMBA

- EN GESTIÓN DEL CONVENIO DE

FINANCIAMIENTO: 3 PROY CHUQUISACA





#### **DEPARTAMENTO: COCHABAMBA**

#### **PROYECTOS PACC I**



**PROYECTOS** 

CONSTRUCCIÓN RIEGO TECNIFICADO AZUL KHOCHA

CONSTRUCCIÓN RIEGO TECNIFICADO ZONA 8 LAHUCHAMA

CONSTRUCCIÓN RIEGO TECNIFICADO SANJA BAJO

CONSTRUCCIÓN RIEGO TECNIFICADO ASHKA YAKU – FIERO MAYU

CONSTRUCCIÓN RIEGO TECNIFICADO LAIME TORO **ESTADO** 

3 PROYECTOS CONCLUIDOS CON ENTREGA DEFINITIVA.

1 PROYECTO EN EJECUCIÓN

1 PROYECTO SIN EJECUCIÓN, POR FALTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL POR PARTE DE GAM. TOTORA ACCIONES

SE REALIZO NOTA AL GAM TIRAQUE SOLICITANDO INICIAR LOS TRAMITES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL





# **DEPARTAMENTO: CHUQUISACA**

#### PROYECTOS PACC I



MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**PROYECTOS PREINVERSIÓN**  **CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE RIEGO PUCA LOMA** 

PROYECTO DE RIEGO **SATOYA** 

PROYECTO DE RIEGO **TACAQUIRA** 

PROYECTO DE RIEGO **PAMPAS DE HUANUYOJ** 

PROYECTO DE RIEGO **CORMAI** 

PROYECTO DE RIEGO **CORMA II** 

CONSTRUCCIÓN **SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES** 

**ESTADO** 

FALTA LA AUTORIZACIÓN **DE LA FINANCIADORA** KfW, DE LA PRIÓRIZACIÓN DE LOS **PROYECTOS PARA LA FASE DE INVERSIÓN SOLICITADO POR GAD CHUQUISACA** 

**ACCIONES** 

**SE LLEVARON REUNIONES CON EL PERSONAL DE GAD** CHUQUISACA, EMAGUA, VRHR Y KFW PARA GAD CHUQUISACA REALICE LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FASE DE INVERSIÓN.









# PROGRAMA DE RIEGO "AGUA Y CAMBIO CLIMATICO" (PACC II)



MONTO: EUR 8.000.000,00

**FINANCIAMIENTO: KFW, Frankurt am Main** 

**VIGENCIA: 31 / 12/ 2023** 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: COCHABAMBA - TIRAQUE

- PROGRAMADOS: 6 PROY PREINVERSIÓN

- PRIORIZADOS : 5 PROYECTOS

- EN GESTIÓN DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO: 5 PROYECTOS



#### **DEPARTAMENTO: COCHABAMBA**



#### **PROYECTOS**

**PROYECTO** 

Construcción Riego Tecnificado Colque Joya Alto

Construcción Riego Tecnificado Churo Grande

Construcción Riego Tecnificado Kimsa Mayu y Churo Pequeño (Sallamani Chico)

Construcción Riego Tecnificado Grupos 1 y 2, Colque Joya Bajo y Cochimita (Sallamani Grande)

Construcción Riego Tecnificado Sankayani Alto y Cochimita **ESTADO** 

SIN EJECUCIÓN, POR LA FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GAD COCHABAMBA Y GAM TIRAQUE

**ACCIONES** 

SE REMITIÓ EL CONVENIO AL GAM TIRAQUE PARA SU CONSIDERACIÓN Y PARA SU FIRMA DEL ALCALDE





# PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO, RESIDUOS SOLIDOS Y DRENAJE PLUVIAL - PROASRED



MONTO: 109.752.000,00 \$

**FINANCIAMIENTO: COORPORACION** 

**ANDINA DE FOMENTO - CAF** 

VIGENCIA: 31/12/2021

**PROYECTOS** 

- EN EJECUCIÓN: 13 PROYECTOS

- CONCLUIDOS: 36 PROYECTOS

- CON DIFICULTAD: 8 PROYECTOS





#### **DEPARTAMENTO: ORURO**



#### PROYECTOS CON DIFICULTAD

**PROYECTO** 

CONST. EMBOVEDADO CANAL TAGARETE FASE I, ORURO (PROASRED) TRAMO I y TRAMO II

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE ORURO - FASE III (PROASRED) – LOTE 8

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CARACOLLO MUNICIPIO DE CARACOLLO **DIFICULTADES** 

PARALIZACION POR FALTA DE PAGOS A EFECTO DEL NO DESEMBOLSO DE LA CONTRAPARTE LOCAL

SE DIVIDIO DE ACUERDO A LOTES, EL LOTE 8 ESTA PARALIZADO YA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA (INFRAESTRUCTURA) ABANDONÓ LA OBRA AL 95%

CONFLICTOS SOCIALES CON COMUNARIOS DEL AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO QUE OBLIGARON A MODIFICAR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. **ACCIONES** 

SE NOTIFICÓ AL GAMO PARA QUE SE REALICE EL DESEMBOLSO COMPROMETIDO EN EL CIF

SE ESTA REALIZANDO LA RESOLUCION DE CONTRATO A LA EMPRESA GARBUS INDESA.

SE NOTIFICO A LA
ALCALDESA DE CARACOLLO
Y NO SE TUVO RESPUESTA
ALGUNA, SE PROCEDERA A
REALIZAR LA INTENCION DE
RESOLUCION AL CONVENIO
POR INCUMPLIMIENTO.



#### **DEPARTAMENTO: POTOSI**

#### **PROYECTOS CON DIFICULTAD**



**PROYECTO** 

CONST. RELLENO SANITARIO DE BETANZOS -POTOSI (PROASRED)

MEJ. Y AMPL. SIST. ALCANT. SANITARIO CIUDAD DE UYUNI

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COQUEZA -POTOSI (PROASRED) **PROBLEMAS** 

PROBLEMAS SOCIALES EN EL SECTOR DE EMPLAZAMIENTO, EXISTE 2 COMUNIDADES QUE RECHAZAN EL PROYECTO.

SE SOLICITO LA 2DA
ENMIENDA PARA PODER
REALIZAR LA LICITACION
A LOS 3 COMPONENTES,
LO CUAL EL GAM DE
UYUNI Y GAD POTOSI NO
CUMPLIERON CON LO
SOLICITADO

EI PROYECTO SE
ENCUENTRA PARALIZADO
DEBIDO A QUE SE REALIZO
LA RESOLUCION DE
CONTRATO CON EL
CONTRATISTA(INFRAESTRU
CTURA)

**ACCIONES** 

SE NOTIFICÓ AL GAM BETANZOS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO, SE ESTA REALIZANDO LA INTENCION DE RESOLUCION DE CONVENIO

SE NOTIFICO AL GAM
UYUNI ENVIAR LA
DOCUMENTACION
NECESARIA PARA LA 2DA
ENMIENDA, LO CUAL NO
CUMPLIO Y SE REALIZARA
LA INTENCION DE
RESOLUCION AL
CONVENIO

SE ESTA REALIZANDO LA CONCILIACION DE SALDOS CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA PODER REALIZAR LA LICITACION Y CONTINUAR CON EL PROYECTO



#### **DEPARTAMENTO: TARIJA**









SE NOTIFICÓ AL GAM
SAN LORENZO PARA
QUE SE REALICE EL
DESEMBOLSO
COMPROMETIDO EN EL
CIF, LA EMPRESA
CONTRATISTA ESTA
SOLICITANDO UNA
RESOLUCION DE
CONTRATO DEBIDO A
QUE NO FUE
CANCELADO DE PARTE
DEL GAM SAN LORENZO



# PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ÁREAS PERIURBANAS (PASAP)



MONTO: € 20.000.000 (Veinte Millones de Euros) (UE)

SEK 80.000.000 (Ochenta Millones de Coronas Suecas) (Suecia)

FINANCIAMIENTO: LA UNIÓN EUROPEA REPRESENTADA POR LA COMISIÓN EUROPEA y SUECIA REPRESENTADA POR LA AGENCIA SUECA

**VIGENCIA: CONVENIO VENCIDO** 

#### **PROYECTOS**

- CONCLUIDOS: 40 PROYECTOS

- CON DIFICULTAD: 1 PROYECTO



#### **DEPARTAMENTO: ORURO Y LA PAZ**



#### PROYECTOS CON DIFICULTADES



CONST. SIST. ALCANT. SANITARIO BARRIOS PERIURBANOS FASE II -ORURO (PASAP)

CONST. Y MEJ. SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ARAPATA -CORIPATA - LA PAZ (PASAP)

DIAGN. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ORURO -PASAP







#### **DEPARTAMENTO: ORURO**

#### **PROYECTOS CON DIFICULTADES**





FORMUL. PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL ORURO - PASAP **DIFICULTAD** 

TIENE UNA RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y HA PRESENTADO SU PLANILLA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA SER REVISADA **ACCIONES** 

SE DEBE REVISAR LA
PLANILLA CON LOS
SALDOS A PAGARSE Y
POSTERIORMENTE
SOLICITAR LA
CONTRATACIÓN DE UNA
NUEVA EMPRESA
CONSULTORA



## PLAN NACIONAL DE CUENCAS - COSECHA DE AGUA (PNC)



MONTO: A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2008 Y ANUALMENTE SE ELABORÓ UN POA EN BASE DEL PLAN QUINQUENAL.

FINANCIAMIENTO: LOS PAÍSES BAJOS, SUECIA, DINAMARCA, SUIZA Y ALEMANIA REPRESENTADOS POR LA ACI.

**VIGENCIA: CONVENIO VENCIDO** 

#### **PROYECTOS**

- EN EJECUCIÓN: 1 PROYECTO

- CONCLUIDOS: 1 PROYECTO

- CON DIFICULTAD: 2 PROYECTOS



#### **DEPARTAMENTO: COCHABAMBA**



#### PROYECTOS CON DIFICULTAD

**PROYECTO** 

PLAN NACIONAL DE CUENCAS - COSECHA DE AGUA (PNC)

**DIFICULTAD** 

- TRAMO 1: ESTE TRAMO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A INACCESIBILIDAD A OBRA POR DERRUMBE DE VÍAS DE ACCESO OCASIONADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES
- TRAMO 2: ESTE TRAMO ESTÁ CON ENTREGA PROVISIONAL, Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES

**ACCIONES** 

- SE REINICIARÁN LAS OBRAS EN EL TRAMO 1, UNA VEZ SE HABILITEN LOS ACCESOS AL LUGAR DE LA OBRA.



#### PROGRAMA AGUA POTABLE Y RIEGO TARIJA



MONTO: 330.050.402,92 Bs

FINANCIAMIENTO: MMAyA, GADT y GAMT

**VIGENCIA: HASTA CONCLUSION Y CIERRE** 

#### **PROYECTOS**

- EN EJECUCIÓN: 8 PROYECTOS

- CONCLUIDOS: 6 PROYECTOS

- CONFLICTIVOS: 1 PROYECTOS





#### **DEPARTAMENTO: TARIJA**



#### **PROYECTOS CON DIFICULTADES**



Construcción Presa Sella Rumicancha Fase I - Tarija **PROBLEMAS** 

- Por imprevistos en la fundación del cuerpo de la Presa, se requiere de 52 millones de bolivianos aproximadamente para concluir la Fase I.
- Planillas de Avance de Obra sin cancelación por la contraparte GADT, a través de Fideicomiso

**ACCIONES** 

- Envío al VRHR del estudio y presupuesto para completar la Fase
- Notas y Reuniones con FNDR para proceder con las cancelaciones,



# PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR



MONTO: 12'344.205,10 EUROS

**FINANCIAMIENTO: KfW** 

**VIGENCIA: 31 / Dic / 2020** 

**PROYECTOS** 

- EN EJECUCIÓN: 10 PROYECTOS

- CONCLUIDOS: 3 PROYECTOS

- CONFLICTIVOS: 3 PROYECTOS





#### **DEPARTAMENTO: TARIJA**



#### PROYECTOS CON DIFICULTADES

**PROYECTO** 

L1: Construcción del Subsistema de Agua Potable Las Tipas

L2: Construcción del Subsistema de A.P. Las Barrancas

L3: Construcción de las nuevas PTAPS "La Tabladita y Alto Senac" **PROBLEMAS** 

Con Recepción Provisional, pero el caudal captado es inferior al previsto en el Diseño Final

Planillas de Avance de Obra sin Cancelar por la contraparte a través de Fideicomiso

Planillas de Avance de Obra sin Cancelar por la contraparte a través de Fideicomiso. Suspendido por Falta de Cancelación de Planillas de Avance de Obra **ACCIONES** 

Acuerdo con Conocimiento del Financiador para Subsanar el déficit de caudal de captación

Notas y Reuniones con FNDR para proceder con las cancelaciones

Notas y Reuniones con FNDR para proceder con las cancelaciones. Envío Nota a Empresa para levantar la Suspensión



### PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO



MONTO: 133.015.136 \$

FINANCIAMIENTO: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO FONDO NÓRDICO DE DESARROLLO (NDF)
FONDO ESTRATÉGICO SOBRE EL CLIMA (FEC)

VIGENCIA: 29/01/2016 - 07/03/2021

#### **PROYECTOS**

- EN EJECUCIÓN: 10 PROYECTOS

- CON DIFICULTAD: 6 PROYECTOS



#### **DEPARTAMENTO: LA PAZ**

#### PROYECTOS CON DIFICULTAD



PROYECTO:

CONST. PRESA KHOTIA Y PRESA TAYPICHACA - PUCARANI (BID MULTIPROPOSITO)

**DIFICULTADES** 

Paralizado, Khotya Khota se tienen conflictos sociales por compensación del área de inundación realizado por EPSAS, y Presa Taypichaca paralizado por lluvias. **ACCIONES** 

Se realizan gestiones con las entidades correspondientes para la resolución de conflicto.

Taypichaca iniciara pasadas las lluvias.



#### **LOGROS OBTENIDOS**



- 1. Incrementar la disponibilidad de agua potable para el sistema de abastecimiento de las ciudades y sus municipios.
- 2. Mejorar y ampliar la utilización de los sistemas de riego.
- 3. Promover la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales en un contexto de Cambio Climático.
- 4. Reducir los riesgos de Infecciones Diarreicas Agudas (IDAs) en la población y contaminación ambiental, mediante políticas de asistencia sanitaria.

5. Ampliar las coberturas de los de alcantarillado sistemas sanitario y de esta forma mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las familias, a través del saneamiento básico, proporcionando sistema de alcantarillado sanitario que beneficie a la población, contribuyendo a la eliminación de riesgos de enfermedades de origen hídrico y contaminación del medio ambiente, para el mejor desarrollo económico y social a corto y mediano plazo.



#### PROYECTOS DE IMPACTO





CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIOS (PTAR) – VIACHA – LA PAZ.

AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 - EL ALTO – LA PAZ

AMPL. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA VILLA 1RO DE MAYO - SANTA CRUZ.

CONSTRUCCION PRESA Y SISTEMA DE RIEGO CABILDO HILCHACO - CHUQUISACA.

CONSTRUCCION PRESA SELLA RUMICANCHA, FASE I – TARIJA.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANCOMUNIDAD BUSTILLO (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI)

AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO - COCHABAMBA

CONSTRUCCION PRESA SISTEMA DE RIEGO TAYAQUIRA - ORURO





#### **GERENCIA NACIONAL JURIDICA**

CONTRATOS	CONTRATOS	CONVENIOS DE	ENMIENDAS
ADMINISTRATIVOS DE	ADMINISTRATIVOS DE	PASANTIAS	CONVENIOS
PERSONAL EVENTUAL	SERVICIOS GENERALES		
277 CONTRATOS	17 CONTRATOS	11 CONVENIOS	5 ENMIENDAS




### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 REPROGRAMADO VS. EJECUTADO



PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO Bs338.137.275,00

PRESUPUESTO VIGENTE REPROGRAMADO Bs489.588.340,49

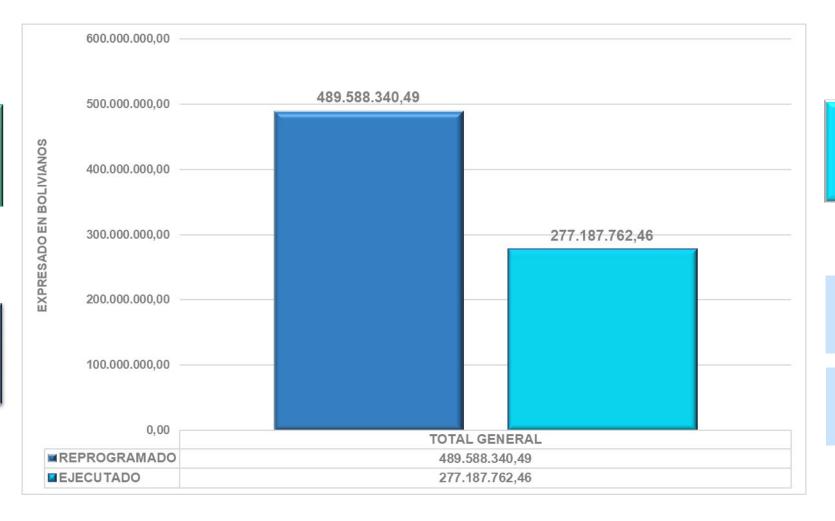

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO Bs277.187.762,46


% DE CUMPLIMIENTO REPROGRAMADO VS. EJECUTADO

56,62%



### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 REPROGRAMADO VS. EJECUTADO POR PROGRAMAS




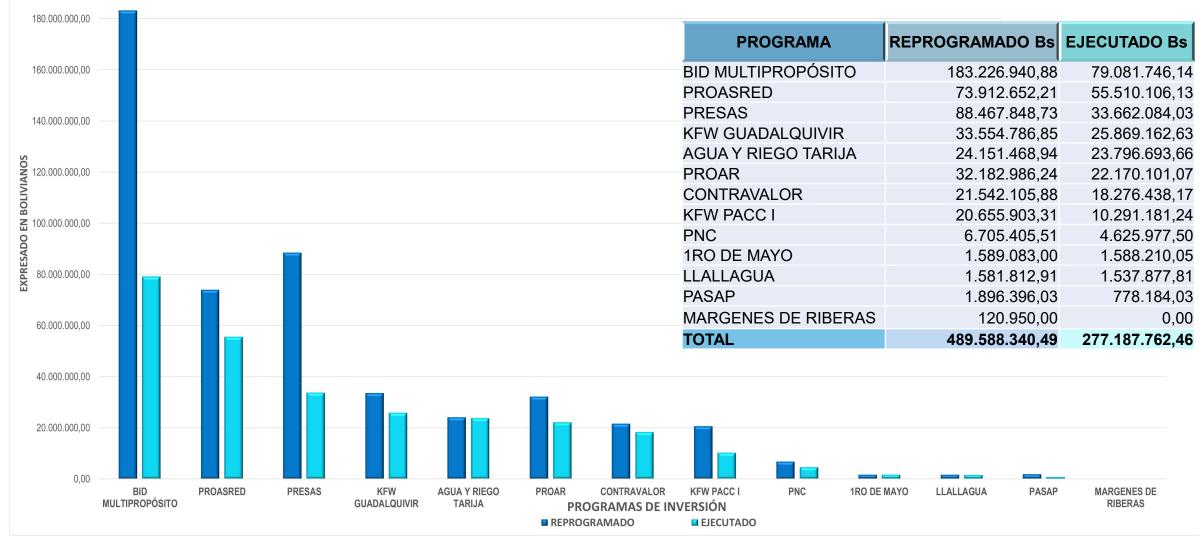







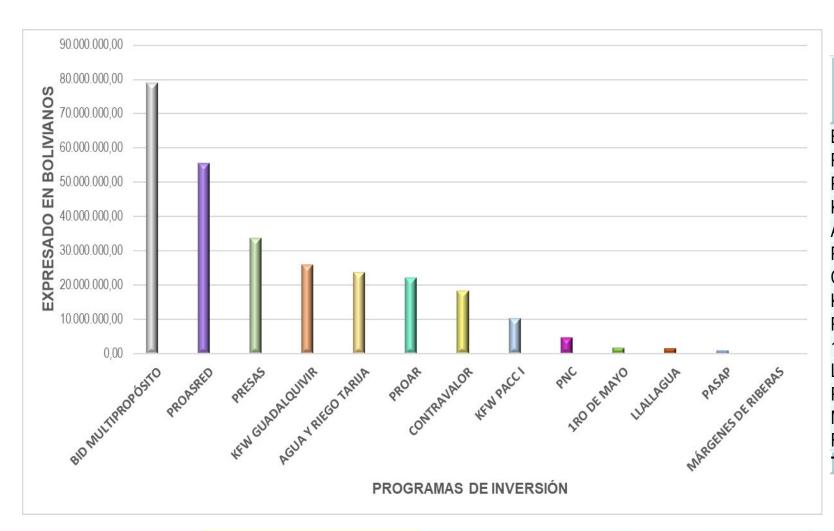


NOMBRE DE	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO A TOTAL
PROGRAMA	Bs	REPROGRAMADO
BID MULTIPROPÓSITO	79.081.746,14	16,15%
PROASRED	55.510.106,13	11,34%
PRESAS	33.662.084,03	6,88%
KFW GUADALQUIVIR	25.869.162,63	5,28%
AGUA Y RIEGO TARIJA	23.796.693,66	4,86%
PROAR	22.170.101,07	4,53%
CONTRAVALOR	18.276.438,17	3,73%
KFW PACC I	10.291.181,24	2,10%
PNC	4.625.977,50	0,94%
1RO DE MAYO	1.588.210,05	0,32%
LLALLAGUA	1.537.877,81	0,31%
PASAP	778.184,03	0,16%
MÁRGENES DE RIBERAS	0,00	0,00%
TOTAL EJECUTADO	277.187.762,46	56,62%



### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 EJECUTADO POR MES



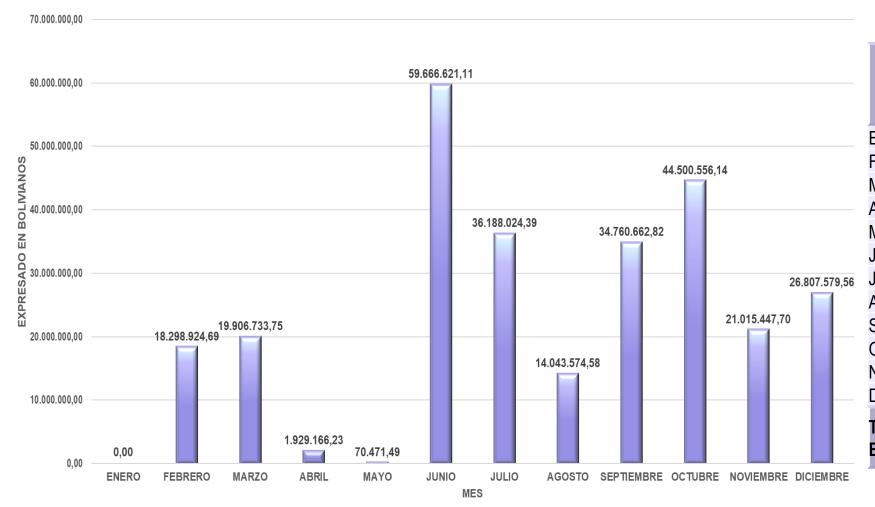


MES	MONTO EJECUTADO Bs	% RESPECTO A TOTAL REPROGRAMADO
ENERO	0,00	0,00%
FEBRERO	18.298.924,69	3,74%
MARZO	19.906.733,75	4,07%
ABRIL	1.929.166,23	0,39%
MAYO	70.471,49	0,01%
JUNIO	59.666.621,11	12,19%
JULIO	36.188.024,39	7,39%
AGOSTO	14.043.574,58	2,87%
SEPTIEMBRE	34.760.662,82	7,10%
OCTUBRE	44.500.556,14	9,09%
NOVIEMBRE	21.015.447,70	4,29%
DICIEMBRE	26.807.579,56	5,48%
TOTAL EJECUTADO	277.187.762,46	56,62%



## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 PROMEDIO DE EJECUCIÓN



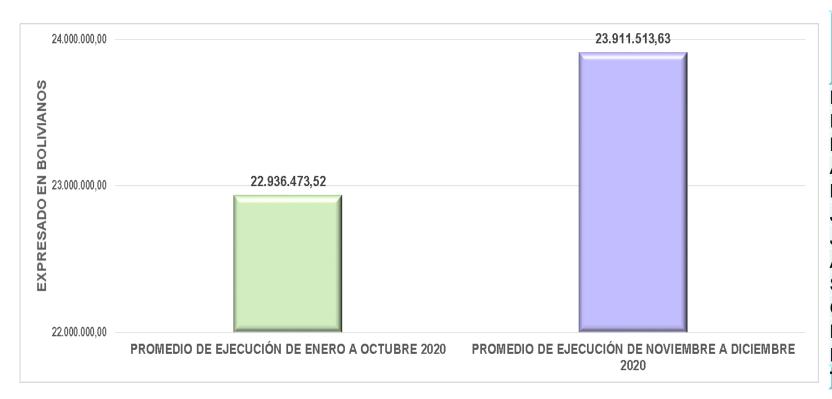


MES	MONTO EJECUTADO Bs	PROMEDIO DE EJECUCIÓN
ENERO	0,00	
FEBRERO	18.298.924,69	
MARZO	19.906.733,75	
ABRIL	1.929.166,23	
MAYO	70.471,49	22.936.473,52
JUNIO	59.666.621,11	22.930.473,32
JULIO	36.188.024,39	
AGOSTO	14.043.574,58	
SEPTIEMBRE	34.760.662,82	
OCTUBRE	44.500.556,14	
NOVIEMBRE	21.015.447,70	23.911.513,63
DICIEMBRE	26.807.579,56	23.911.313,03
TOTAL	277.187.762,46	



### CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN 2020 POR PROGRAMA



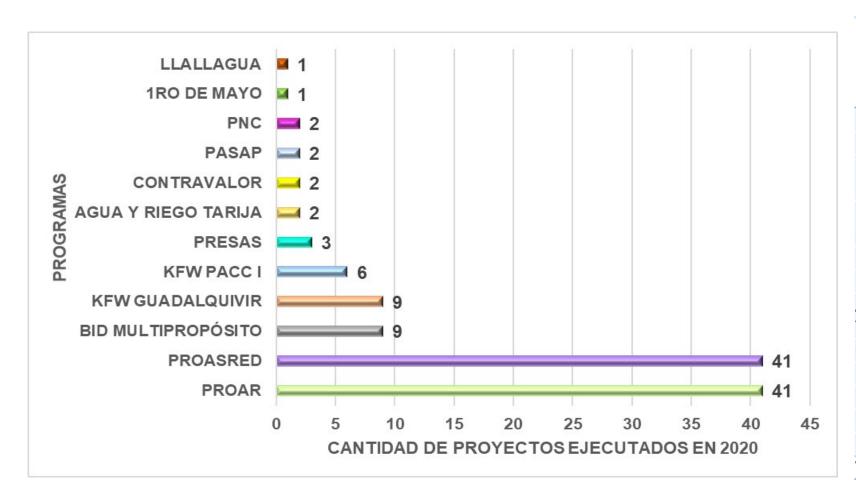

PROGRAMA	CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN 2020
PROAR	41
PROASRED	41
BID MULTIPROPÓSITO	9
KFW GUADALQUIVIR	9
KFW PACC I	6
PRESAS	3
AGUA Y RIEGO TARIJA	2
CONTRAVALOR	2
PASAP	2
PNC	2
1RO DE MAYO	1
LLALLAGUA	1
TOTAL	119




# PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2020 REPROGRAMADO VS. EJECUTADO



PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO Bs27.676.563,00

PRESUPUESTO VIGENTE REPROGRAMADO Bs31.412.842,17

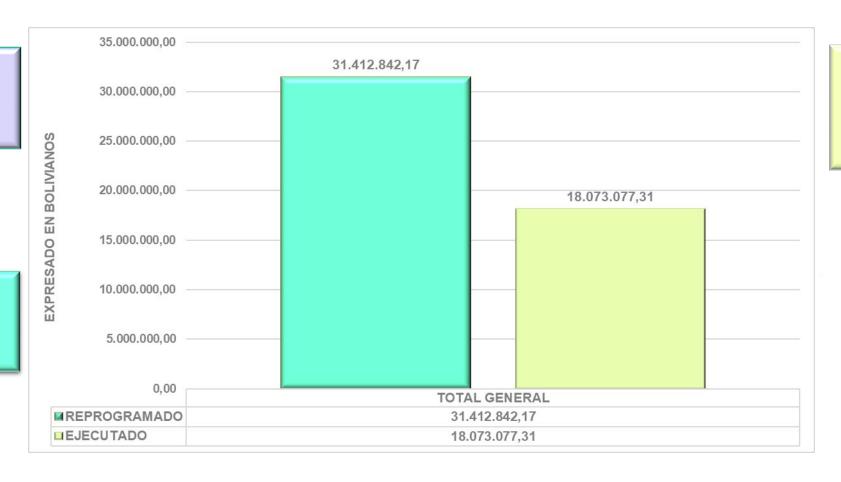

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADO Bs18.073.077,31


% DE CUMPLIMIENTO REPROGRAMADO VS. EJECUTADO

57,53%



# PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2020 EJECUTADO POR PROGRAMAS



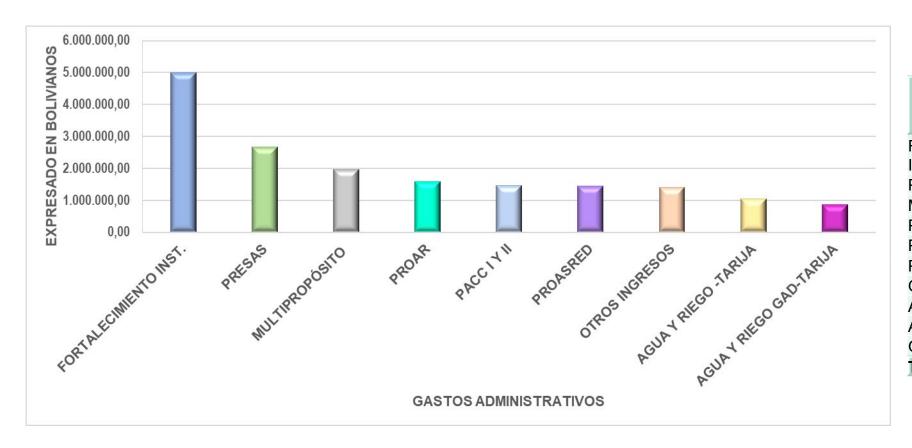

GASTOS ADMINISTRATIVOS	MONTO EJECUTADO
PROGRAMA/ACTIVIDAD	Bs
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.998.927,24
PRESAS	2.678.792,53
MULTIPROPÓSITO	1.975.303,24
PROAR	1.596.021,59
PACC I Y II	1.461.447,29
PROASRED	1.450.892,44
OTROS INGRESOS	1.413.086,69
AGUA Y RIEGO -TARIJA	1.037.196,01
AGUA Y RIEGO GAD-TARIJA	872.792,05
GAMEA	588.618,23
TOTAL	18.073.077,31





#### **RONDA DE PREGUNTAS**

**LECTURA DEL ACTA** 





#### ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

# **AGRADECE SU ASISTENCIA**
