



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



EMAGUA
Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL EMAGUA - GESTIÓN 2025

ABRIL 2025

CONTENIDO



1. INTRODUCCIÓN: EMAGUA



2. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL



3. GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL



4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: PRESUPUESTO INICIAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 (A MARZO)



5. GESTIÓN TÉCNICA: PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



6. CONCLUSIONES GESTIÓN 2025

ABRIL 2025

1. INTRODUCCIÓN: EMAGUA

CONSTRUCCIÓN PESA PANANTI (YACUIBA)

ABRIL 2025

Mandato Legal Decreto Supremo Nro. 0163 del 10 de junio del 2009

Art. 2 Creación y Finalidad

Se crea EMAGUA bajo tuición del MMAYA con la finalidad de **ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo.**

Art. 3 Naturaleza Institucional

EMAGUA es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida.


Art. 5 Competencias

- 1. Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo.**
- 2. Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión para el desarrollo.**
- 3. Coadyuvar en la gestión de recursos externos**
- 4. Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o cofinanciamiento con entidades públicas y/o privadas, para la ejecución de programas y proyectos...**
- 5. Administrar los recursos internos y externos asignados, ...**
- 6. Realizar transferencias monetarias y/o en especie público-privadas de acuerdo a lo establecido en los convenios de origen de los recursos, en el marco de la normativa vigente.**

EJECUTAMOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN:



PRINCIPALES PROCESOS DE EMAGUA

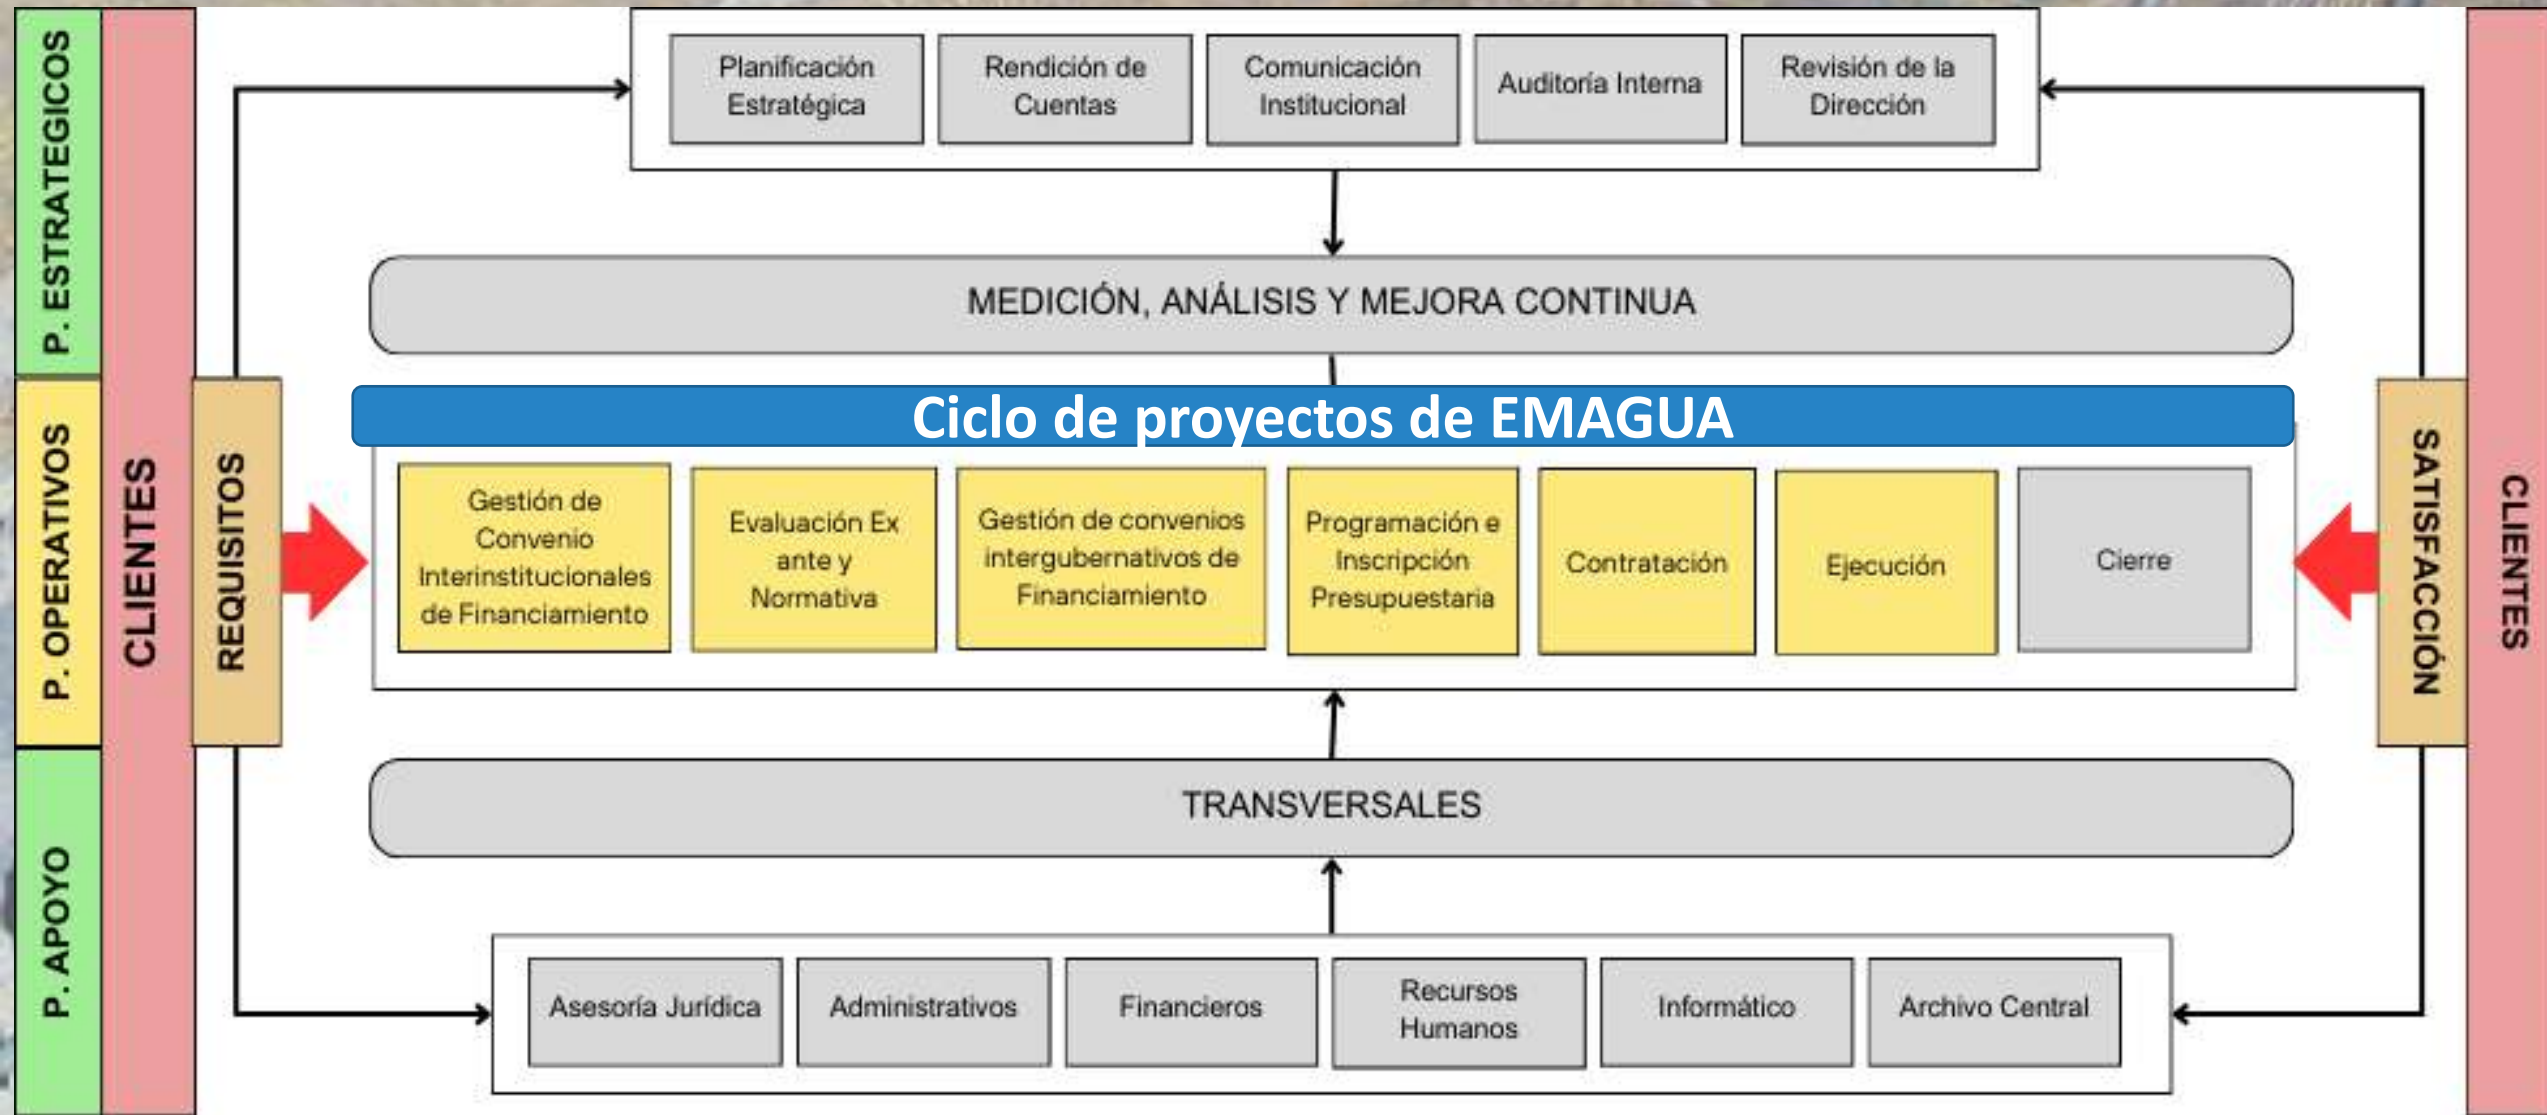

CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ley N°341



Dar a Conocer el Proyecto: Lista de beneficiarios; Socialización; Conformación del Comité de Acompañamiento y Apoyo a la Obra.



Proceso de Licitación: participación como veedores



Construcción: Asambleas informativas; Visitas Técnicas



Recepción Provisional: Capacitación; Visitas Técnicas



Post entrega y Recepción Definitiva: Capacitación; transferencia de infraestructura a entidades

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE RIEGO SATOYA

ABRIL 2025

ENFOQUE POLÍTICO: Principios y Valores

Es la orientación política de la Entidad Pública, la cual se considera la razón de ser de la entidad, determinada por su respectiva norma de creación y lo que la entidad quiere ser y lo que quiere lograr en el quinquenio 2021-2025, concordante al PDES, PSDI, PEM o PTDI.

EMAGUA busca “gestionar eficazmente y ejecutar eficientemente los programas y proyectos de inversión pública (en todas sus fases Pre-Inversión, Inversión y Post-Inversión) contribuyendo así para la “Reconstrucción de la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, constituyéndose para el largo plazo en una INSTITUCIÓN LÍDER en la ejecución de programas y proyectos de: agua potable, saneamiento básico, riego, manejo integral de cuencas, gestión integral de recursos hídricos, medio ambiente y cambio climático basado en un modelo de gestión por resultados, participativos, sustentable y transparente, eficaz, eficiente y con rigor técnico.”.

Ama suwa (No seas ladrón)
Ama quilla (No seas flojo)
Ama llulla (No seas mentiroso)

VALORES

- Transparencia
 - Compromiso
 - Complementariedad
 - Excelencia
 - Responsabilidad
 - Resultados

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA: PILARES (13) Y EJES ESTRATÉGICOS (10)

PILAR 2

**EJE
ESTRATÉGICO 1**

**Reconstruyendo la Economía,
Retomando la Estabilidad
Macroeconómica y Social**

PILAR 6

**EJE
ESTRATÉGICO 3**

**Seguridad Alimentaria con
Soberanía, Promoción de
Exportaciones con Valor
Agregado y Desarrollo Turístico**

PILAR 9

**EJE
ESTRATÉGICO 8**

**Medio Ambiente Sustentable y
Equilibrado en Armonía con la
Madre Tierra**

PILAR 11

**EJE
ESTRATÉGICO 7**

**Reforma Judicial, Gestión Pública
Digitalizada y Transparente
Seguridad y Defensa Integral con
Soberanía Nacional**

**AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO**



**RECURSOS HÍDRICOS Y
RIEGO**




**GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- CAMBIO CLIMÁTICO**




3. GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL

CONSTRUCCIÓN REPRESA ÑOQUEJZA DISTRITO YAWISLA (VITICHI)


ABRIL 2025

PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS JUDICIALES	CANTIDAD	TOTAL
PENALES	22	45
CONTENCIOSOS	22	
LABORAL	1	



Asumir la defensa legal en los procesos judiciales en los que EMAGUA es parte demandante y/o demandada, precautelando los intereses de la Entidad, y por ende, del Estado Plurinacional de Bolivia.



4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: PRESUPUESTO INICIAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025

CONSTRUCCIÓN REPRESA VALLE DE TIN TIN Y SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO MIZQUE


ABRIL 2025

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2025



PRESAS: 141,5 MM \$us (2026)



PACC I & II: 29 MM \$us (2026)



PASCIM: 76 MM \$us (2027)



PERIURBANOS: 21 MM \$us (2027)



MULTIPROPOSITO: 134 MM \$us (2025)



PROASRED: 107 MM \$us (2025)



APS: 5 MM \$us (2025)



CONTRAVALOR: 7 MM \$us (2025)



PAPAG: 31 MM \$us (2025)



PROAR: 152 MM \$us (2025)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIÓN 2025: EMAGUA (31-03-25)

- ❑ PRESUPUESTO INICIAL: **Bs244.379.158.-**
- ❑ PRESUPUESTO VIGENTE: **Bs265.914.708.**

EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA:
Bs64.840.571,95.- (26.53%)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - MMaYa



ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
EMAGUA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO
(En Bolivianos)


TIPO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC (DEV/PI)	% EJEC (DEV/PV)
INV	244.379.158	265.914.708	64.840.572	26,53%	24,38%
Total general	244.379.158	265.914.708	64.840.572	26,53%	24,38%

FUENTE: Datos SIGEP (Reporte al 31-03-2025)


(*) Modificaciones presupuestarias por Bs21.535.549,90.- para la ejecución de más proyectos y programas.

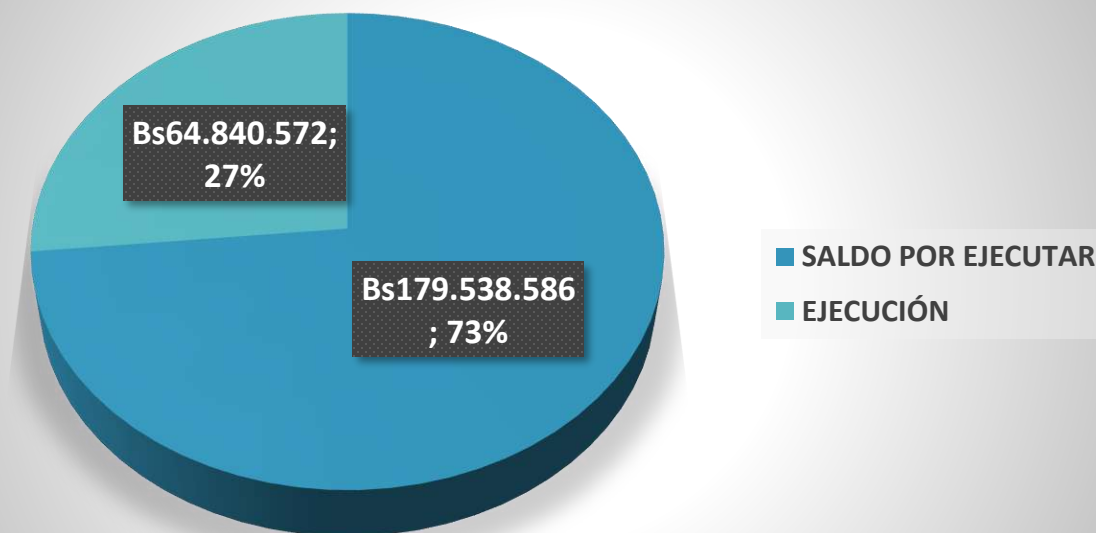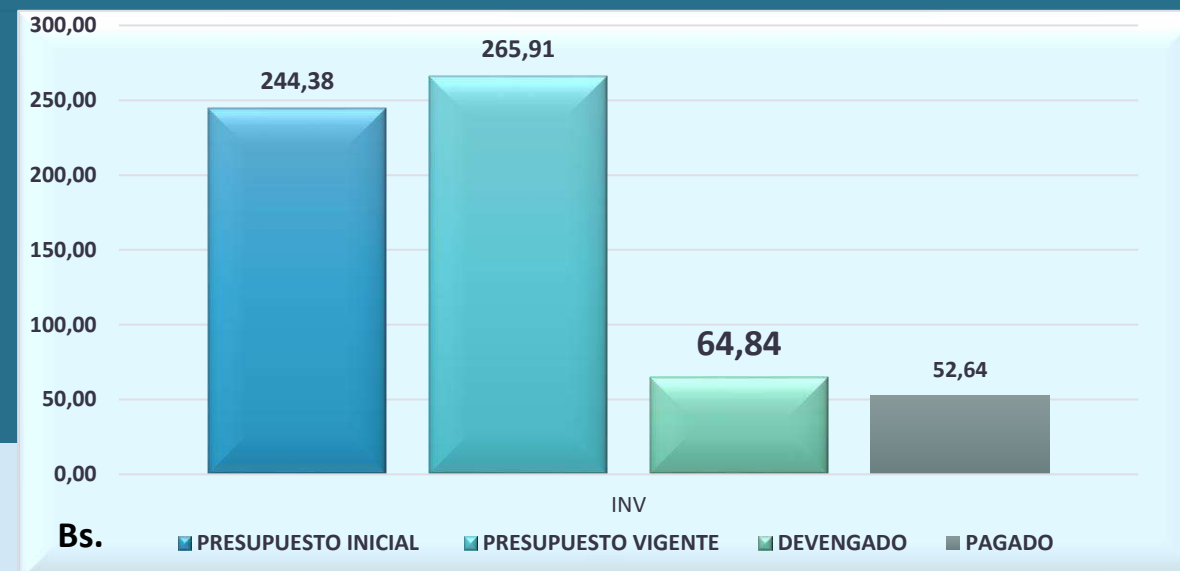

NÚMERO DE PROYECTOS: PRESUPUESTO VIGENTE (En Bs.) (AL 31-03-2025)

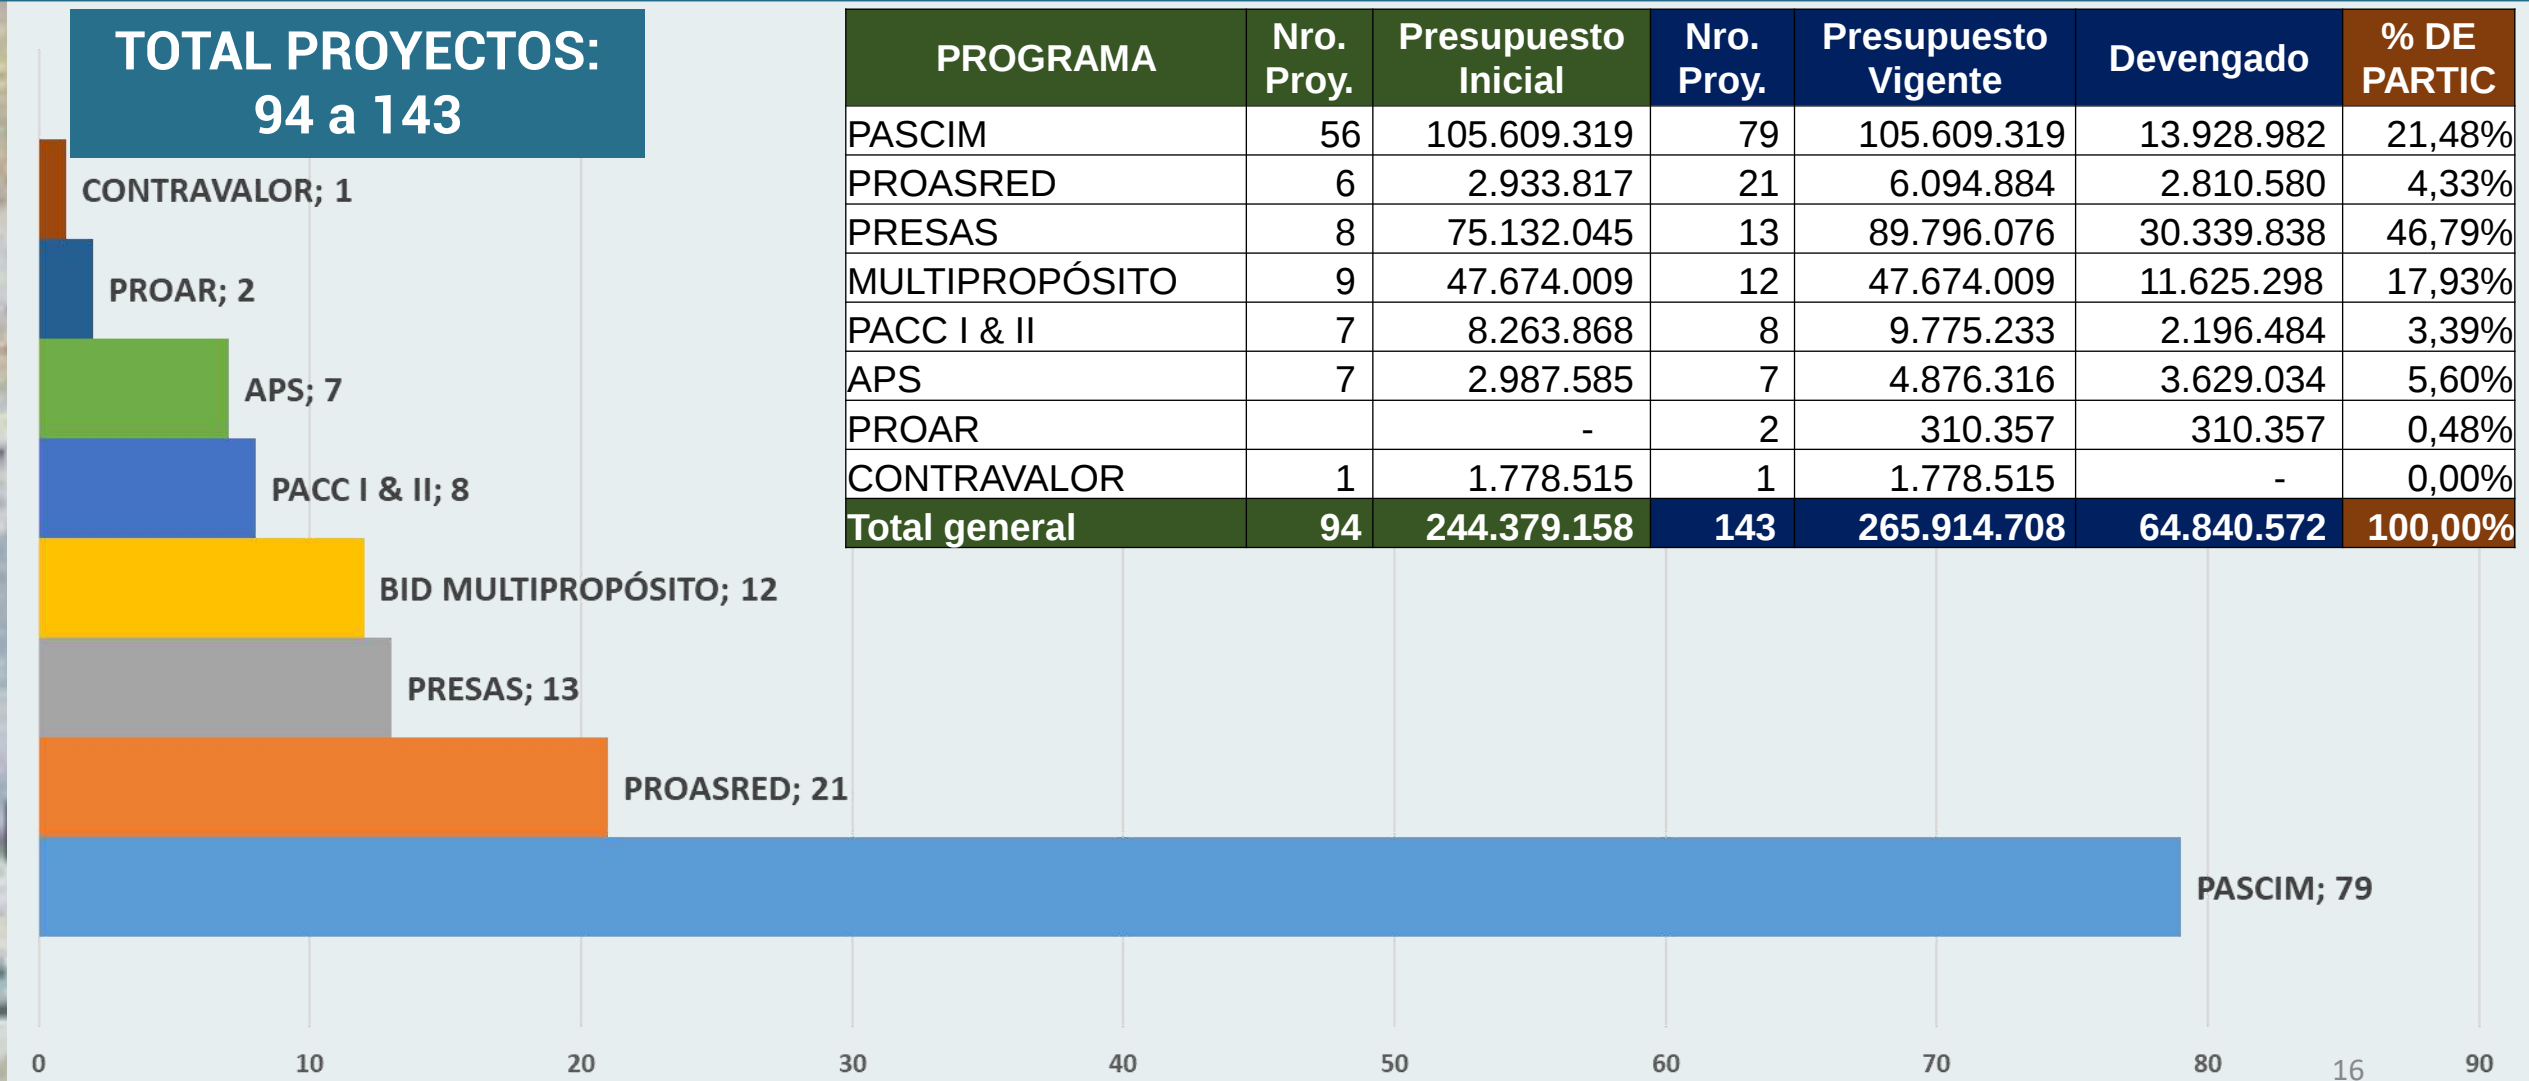

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2025: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL REPORTADO EN SISIN – WEB (En Bolivianos) (PRESUPUESTO INICIAL)

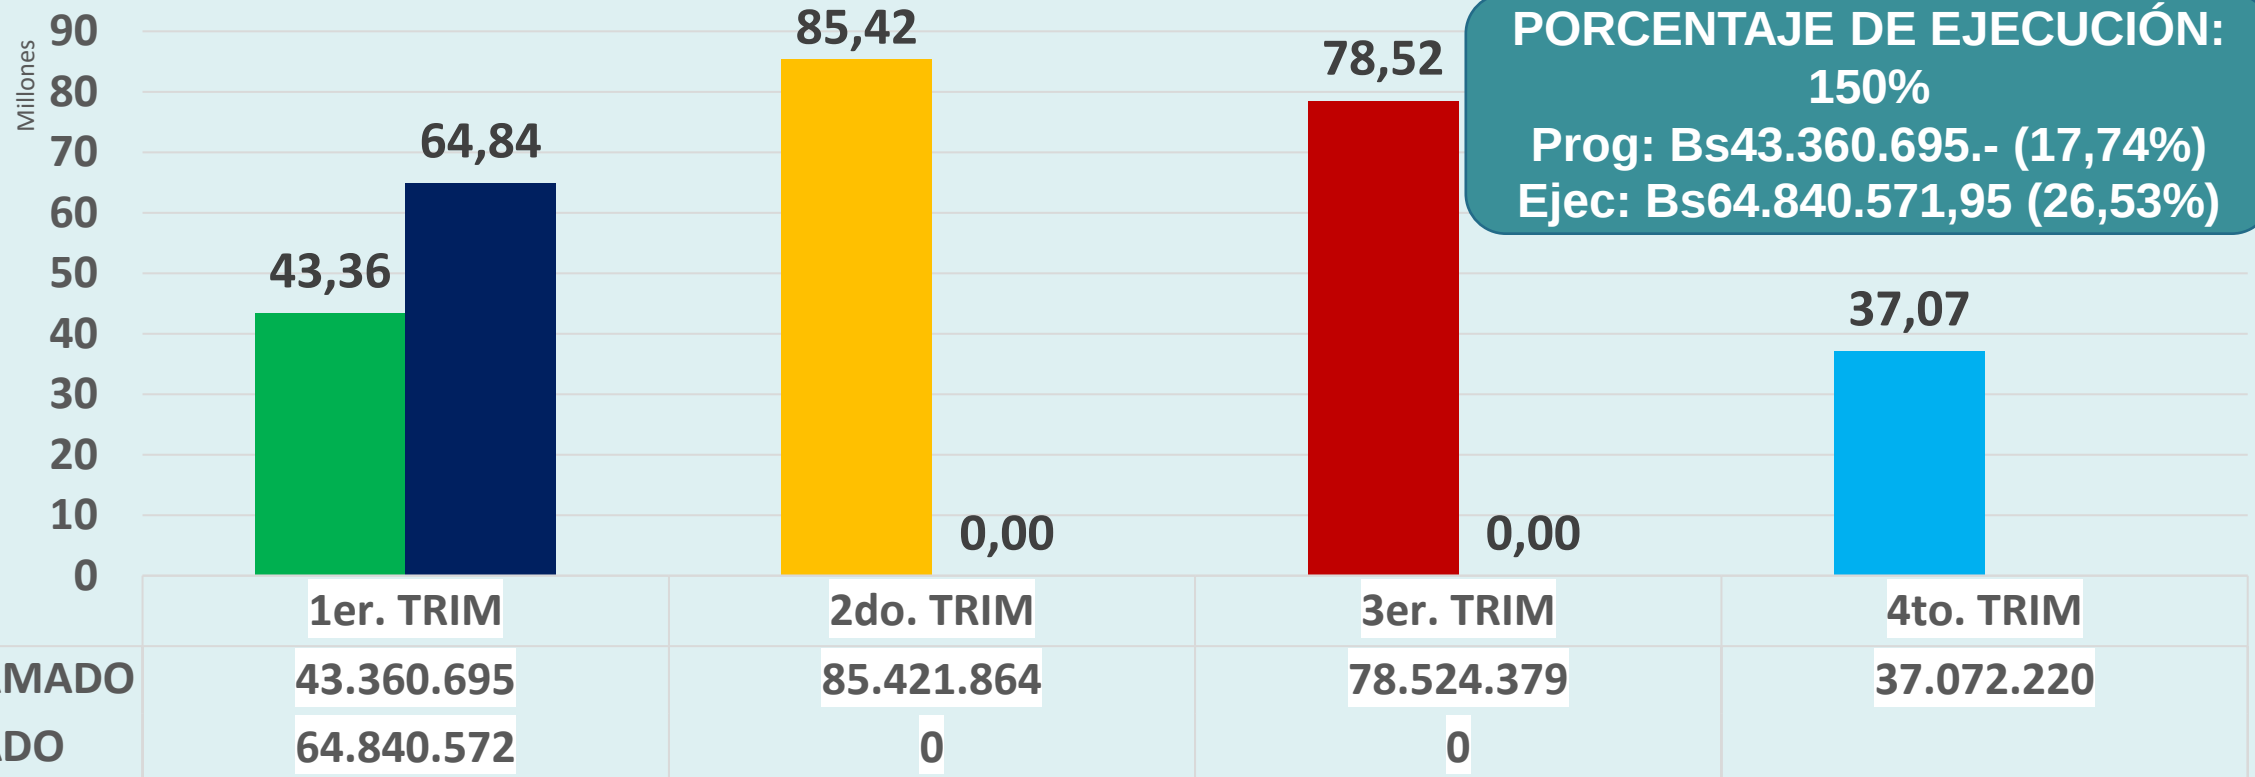

DETALLE	% EJEC	1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM
% PROGRAMACIÓN TRIM	100,00%	17,74%	34,95%	32,13%	15,17%
% EJECUCIÓN TRIM	26,53%	26,53%	0,00%	0,00%	0,00%
% EJECUCIÓN	26,53%	150,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5. GESTIÓN TÉCNICA: PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN REPRESA ANGOSTURA (OMEREQUE)

ABRIL 2025

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2025: PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2025 (En Bolivianos)

- ❑ EN LA GESTIÓN 2025 EJECUTAREMOS 214 PROYECTOS.
- ❑ UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE Bs332,7 MM. (136% RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y EL 80% RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE PROYECTADO)


PROGRAMA	Nro. Proj.	Presupuesto Inicial	Nro. Proj.	Presupuesto Vigente	Devengado	Nro. Proj.	Presupuesto Vigente (Proy.)	Devengado (Proy.)
PASCIM	56	105.609.319	79	105.609.319	13.928.982	147	255.609.319	181.405.985
PROASRED	6	2.933.817	21	6.094.884	2.810.580	21	6.094.884	6.094.884
PRESAS	8	75.132.045	13	89.796.076	30.339.838	13	89.796.076	80.816.468
BID								
MULTIPROPÓSITO	9	47.674.009	12	47.674.009	11.625.298	12	47.674.009	47.674.009
PACC I & II	7	8.263.868	8	9.775.233	2.196.484	9	9.775.233	9.775.233
APS-PASAAS	7	2.987.585	7	4.876.316	3.629.034	8	4.876.316	4.876.316
PROAR		-	2	310.357	310.357	3	310.357	310.357
CONTRAVALOR	1	1.778.515	1	1.778.515	-	1	1.778.515	1.778.515
Total general	94	244.379.158	143	265.914.708	64.840.572	214	415.914.708	332.731.766

ESTADO DE SITUACIÓN DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SISIN WEB - SIGEP - GESTIÓN 2025

ESTADO 2025	NRO. PROYECTOS
CONCLUIDOS	74
CONTINUIDAD	10
INICIO Y EJECUCIÓN	97
PAGOS FINALES	33
Total general	214

EN LA GESTIÓN 2025:

- ❑ INICIAREMOS 97 PROYECTOS
- ❑ CONCLUIREMOS 74 PROYECTOS

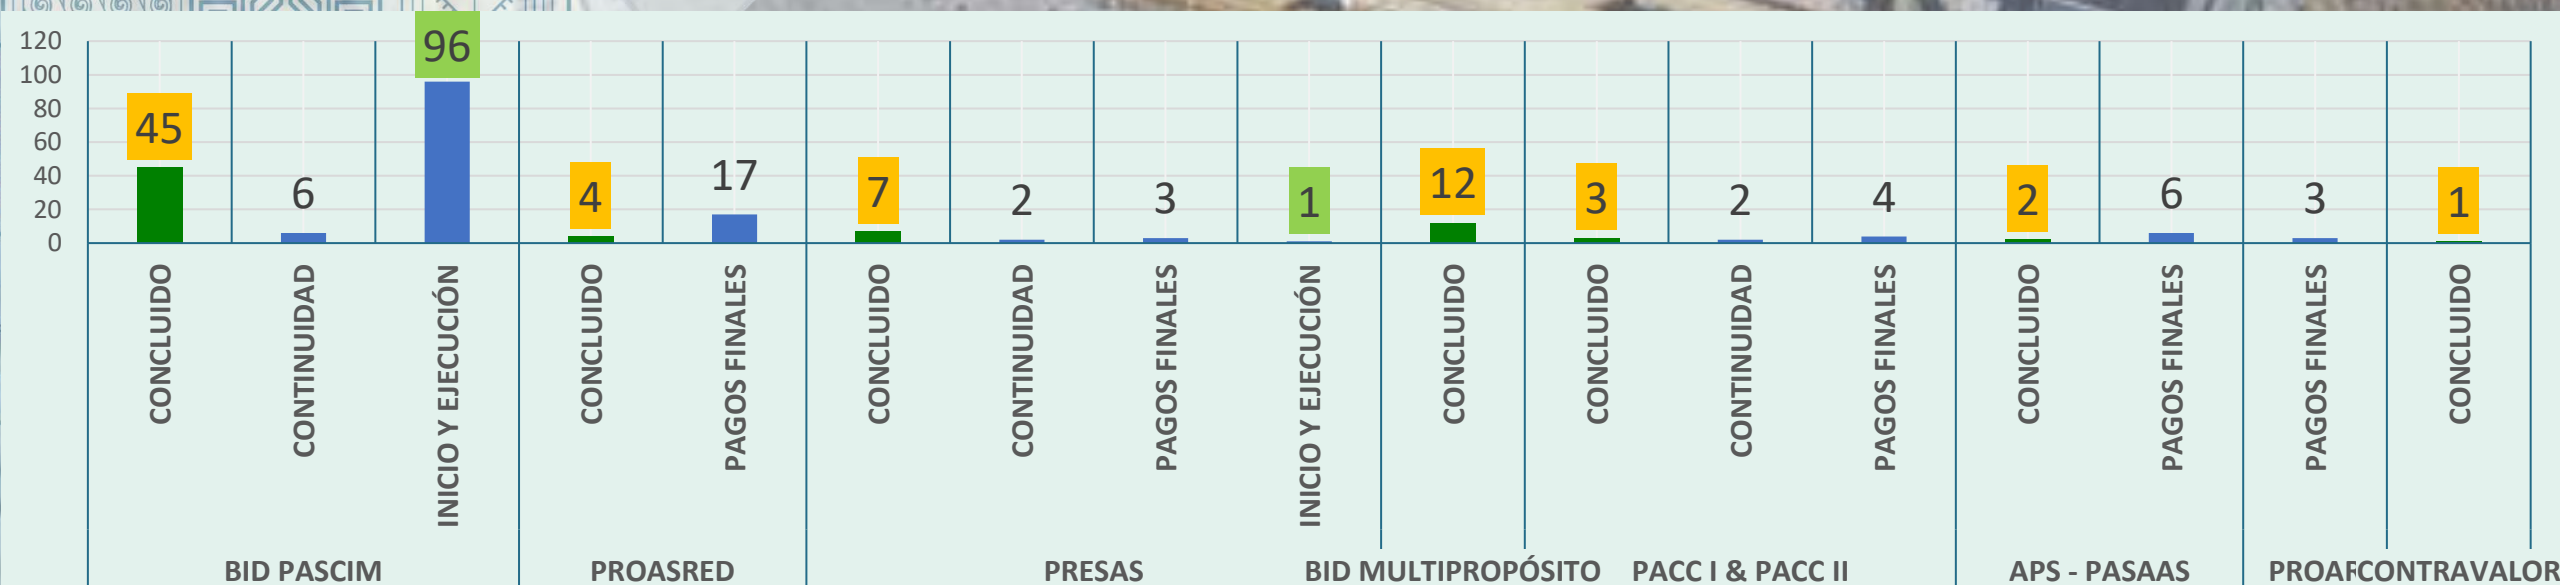

PROGRAMA PRESAS

CONSTRUCCIÓN REPRESA ANGOSTURA (OMEREQUE)

ABRIL 2025

ESTADO DE SITUACIÓN PROGRAMA PRESAS



Valles de Tarabuco



Anfaya el Peral - Yotala



FTE	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPT.	ESTADO
CAF	CONST. PRESA Y SIST. DE RIEGO VALLES TARABUCO MIC - CHQ (PRESAS)	CHQ	CONCLUIDO
CAF	CONST. SISTEMA DE RIEGO ANFAYA DEL PERAL - YOTALA	CHQ	CONCLUIDO
CAF	CONST. SISTEMA DE RIEGO CABILDO HILCHACO (TINGUIPAYA)	PTS	CONCLUIDO
CAF	CONST. REPRESA ANGOSTURA - COCHABAMBA (PRESAS)	CBA	CONCLUIDO
CAF	CONST. REPRESA VACAS KUCHU - CHIWALKI (VACAS)	CBA	EN EJECUCIÓN
CAF	CONST. PRESA PANANTI (YACUIBA)	TRJ	EN EJECUCIÓN
TOTAL PROYECTOS CAF		7	
OFID	CONST. PRESA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO KULLCU (SOROCACHI)	ORU	CONCLUIDO
OFID	CONST. REPRESA ÑOQUEJZA DISTRITO YAWISLA (VITICHI)	PTS	CONCLUIDO
OFID	CONST. REPRESA VALLE DE TIN TIN Y SIST. DE RIEGO PRESURIZADO MIZQUE	CBA	CONCLUIDO
OFID	CONST. SISTEMA DE RIEGO TERACOLLO (PUCARANI)	LPZ	CONCLUIDO
OFID	CONST. SISTEMA DE RIEGO PATAMANTA (PUCARANI)	LPZ	CONCLUIDO
OFID	CONST. SISTEMA DE RIEGO CHUÑAVI, PUCARANI	LPZ	CONCLUIDO
OFID	CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA CAWALLICALA	ORU	CONCLUIDO
OFID	CONST. SISTEMA DE RIEGO LA MADERA (TORO TORO)	PTS	CONCLUIDO
OFID	CONST. REPRESA Y SIST. DE RIEGO ILICHUA (SAN PEDRO DE BUENA VISTA)	PTS	EN EJECUCIÓN
TOTAL PROYECTOS OFID		9	
TOTAL PROGRAMA PRESAS		15	

Cabildo Hilchaco - Tinguipaya



Kullcu - Soracachi



Teracollo - Pucarani



Ñoquejza Yawisla - Vitichi



AL 2024: 5 PRESAS
2025: 7 PRESAS
12 CONCLUIDAS

INDICADORES PROYECTOS CONCLUIDOS - GESTIÓN 2025

**EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 7 PRESAS, QUE
BENEFICIARAN A 3.351 FAMILIAS E INCREMENTARÁN 4.979
HECTÁREAS BAJO RIEGO, CON UNA INVERSIÓN DE
Bs465,1MM**

SECTOR	PROGRAMA	NRO. PROY	UNIDAD DE MEDIDA		MONTO TOTAL
AGROPECUARIO	PRESAS	7	Hectáreas bajo riego	4.979,00	465.150.943,61
Total general		7			465.150.943,61



- PROGRAMA DE RIEGO AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO (PACC I & II)
- APOYOS PRESUPUESTARIOS SECTORIALES (APS)
- PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO, RESIDUOS SÓLIDOS Y DRENAJE PLUVIAL (PROASRED)
- KfW PERIURBANOS SANTA CRUZ

CONSTRUCCIÓN REPRESA ANGOSTURA (OMEREQUE)

INDICADORES PROYECTOS CONCLUIDOS - GESTIÓN 2025

**EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 3 PROYECTOS, QUE
BENEFICIARÁN A 782 FAMILIAS E INCREMENTARÁN 685
HECTÁREAS BAJO RIEGO, CON UNA INVERSIÓN DE Bs48,4 MM**

SECTOR	PROGRAMA	NRO. PROY	UNIDAD DE MEDIDA		MONTO TOTAL
AGROPECUARIO	PACC I & PACC II	3	Hectáreas bajo riego	685,00	48.449.009,30
Total general		3			48.449.009,30

INDICADORES PROYECTOS CONCLUIDOS - GESTIÓN 2025

**EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 2 PROYECTOS, QUE
BENEFICIARÁN A 2.618 FAMILIAS Y 2.513 CONEXIONES, CON
UNA INVERSIÓN DE Bs23,1 MM**

SECTOR	PROGRAMA	NRO. PROY	UNIDAD DE MEDIDA		MONTO TOTAL
SANEAMIENTO	APS	2	CONEXIONES	2.513,00	23.082.686,38
Total general		2			23.082.686,38

INDICADORES PROYECTOS CONCLUIDOS - GESTIÓN 2025

EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 5 PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, QUE BENEFICIARÁN A 93.375.- FAMILIAS, CON UNA INVERSIÓN DE Bs71.27MM

SECTOR	PROGRAMA	NRO. PROY	UNIDAD DE MEDIDA		MONTO TOTAL
SANEAMIENTO	PROASRED	4	CONEXIONES	7.119,00	33.520.209,69
SANEAMIENTO	CONTRAVALOR	1	CONEXIONES	5.278,00	37.758.223,44
Total general		5		12.397,00	71.278.433,13

REACTIVACIÓN DE PROGRAMAS

EN LA GESTIÓN 2025 RECTIVAREMOS EL PROGRAMA PERIURBANO I – SANTA CRUZ PARA AMPLIAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (26.632 familias beneficiarias)


ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y FINANCIADORES:

Préstamo de Cooperación Financiera: 15.7 MM EUR

Aporte propio de Prestatario: 4.47 MM EUR


SAGUAPAC: 0.18 MM EUR

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: 20,35 MM EUR

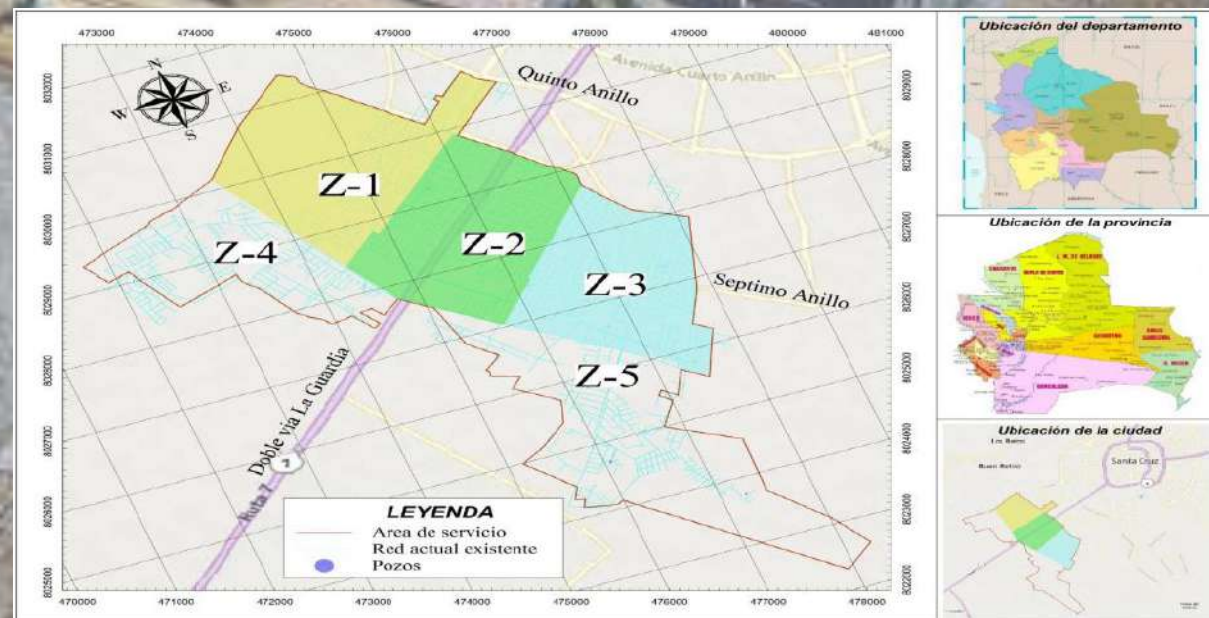



PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO



ABRIL 2025



DATOS GENERALES PROYECTO

Monto Total del Proyecto	\$us 128,59 millones (\$us. 75,49 Mill en Agua Potable y \$us.53.1 Mill en Sistemas de Riego y MIC)
Periodo de Ejecución	23/01/19 al 31/08/2025 (finalización de contrato de préstamo)

Estructura de financiamiento del Programa

	BID	FEC	FONDO NORDICO	TOTAL
PPTO	57,791,229	42,500,000	4,151,500	104,442,729
	GADLP	GAMEA	EPSAS	TOTAL
PPTO	6,448,083	14,454,630	3,242,423	24,145,136

OBJETIVO: Mejorar la provisión del servicio de Agua Potable en el municipio de El Alto y el acceso al agua y riego para Pucarani y Batallas considerando aspectos de resiliencia de Cambio Climático

COMPONENTES:

1. Incremento de la disponibilidad de Agua Potable
2. Mejoramiento ampliación de los sistemas de riego para Batallas y Pucarani
3. Manejo Integral de Cuencas y ordenamiento del territorio con visión de cambio climático **(2024 FINALIZADO)**

PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO


Agua Potable :

+ de 1 millón de
Habitantes Beneficiarios
en la ciudad de El Alto


RIEGO:

6.634 Familias
56 Comunidades
5.600 Ha Bajo Riego

AVANCE FINANCIERO



AVANCE FISICO



COMPONENTE I: PRESAS PARA AGUA Y RIEGO

Presa Taypichaca



COSTO TOTAL \$us 6,30 Millones

Capacidad de volumen de embalse de la Presa 32.00 Hm³

AVANCE FINANCIERO 70,01%
AVANCE FÍSICO 85,44%

ESTADO ACTUAL EN EJECUCIÓN

Presa Khotia Khota



COSTO TOTAL \$us. 1,65 Millones

Capacidad de volumen de embalse de la Presa 10.20 Hm³

AVANCE FINANCIERO 54,09%
AVANCE FÍSICO 79,999%




COSTO TOTAL \$us 36,28 Millones

AVANCE FINANCIERO 91,75%

AVANCE FISÍCO 83,64%

Población beneficiaria: + de 1 millón habitantes de la ciudad de El Alto

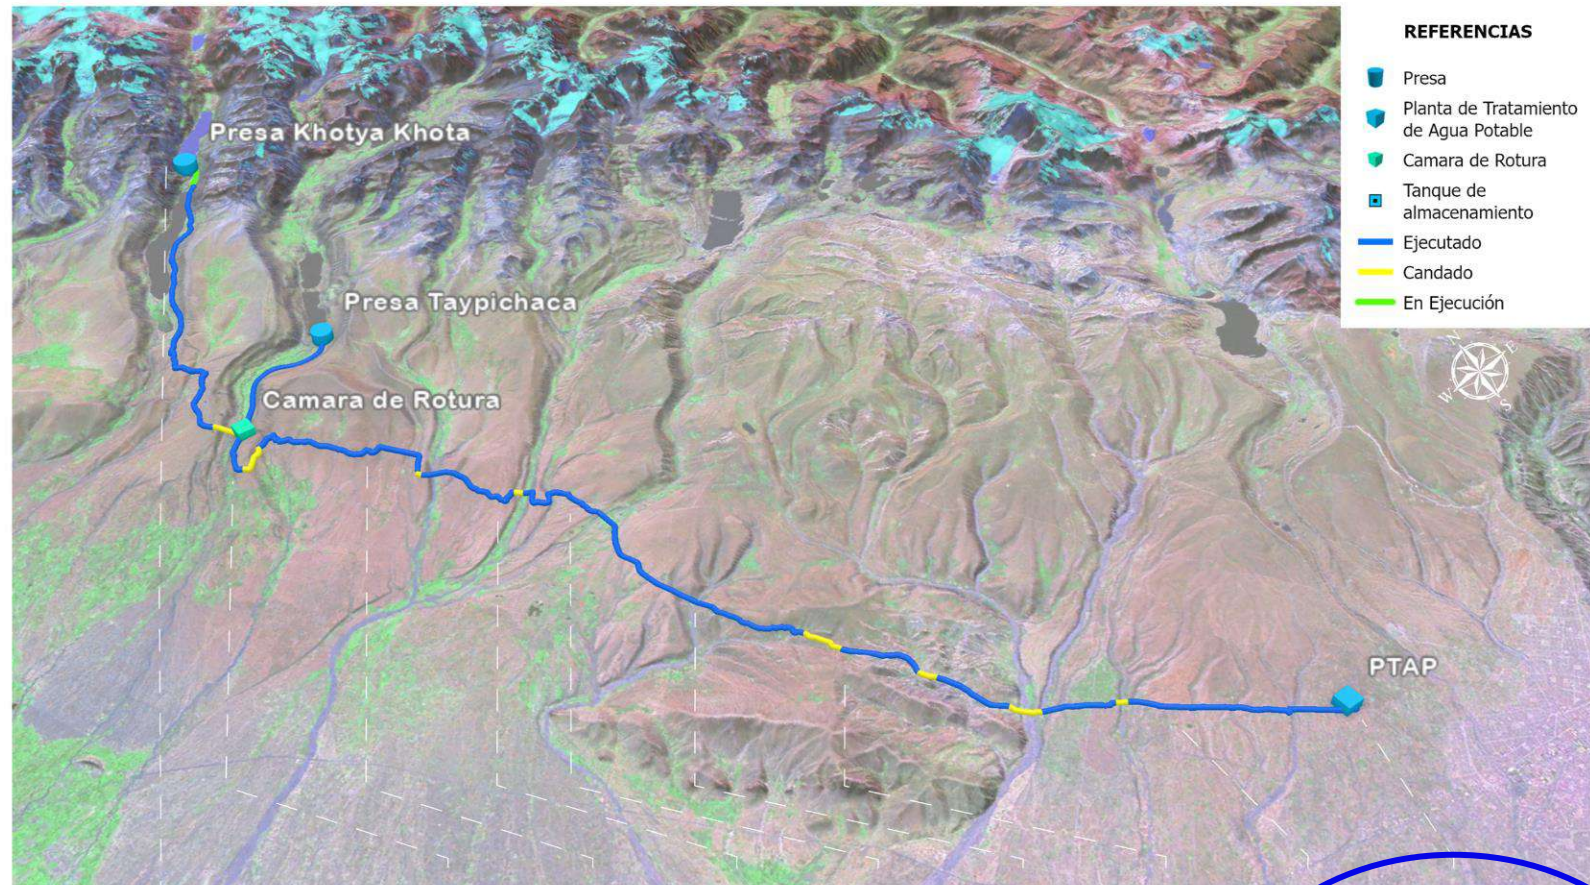[illegible]

COMPONENTE I: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COSTO TOTAL \$us 13,09 Millones

AVANCE FÍSICO: 63,83 %

AVANCE FINANCIERO: 68,77%



**Capacidad de tratamiento de
500L/s 1ra fase y 1000 L/s 2da
Fase**



COMPONENTE I: SISTEMA DE INTERCONEXIÓN EL ALTO


COSTO TOTAL \$us 8,53 Millones

AVANCE FÍSICO: 91,76 %

AVANCE FINANCIERO: 99,51 %



**Longitud de la Interconexión es de
14 Kilómetros**

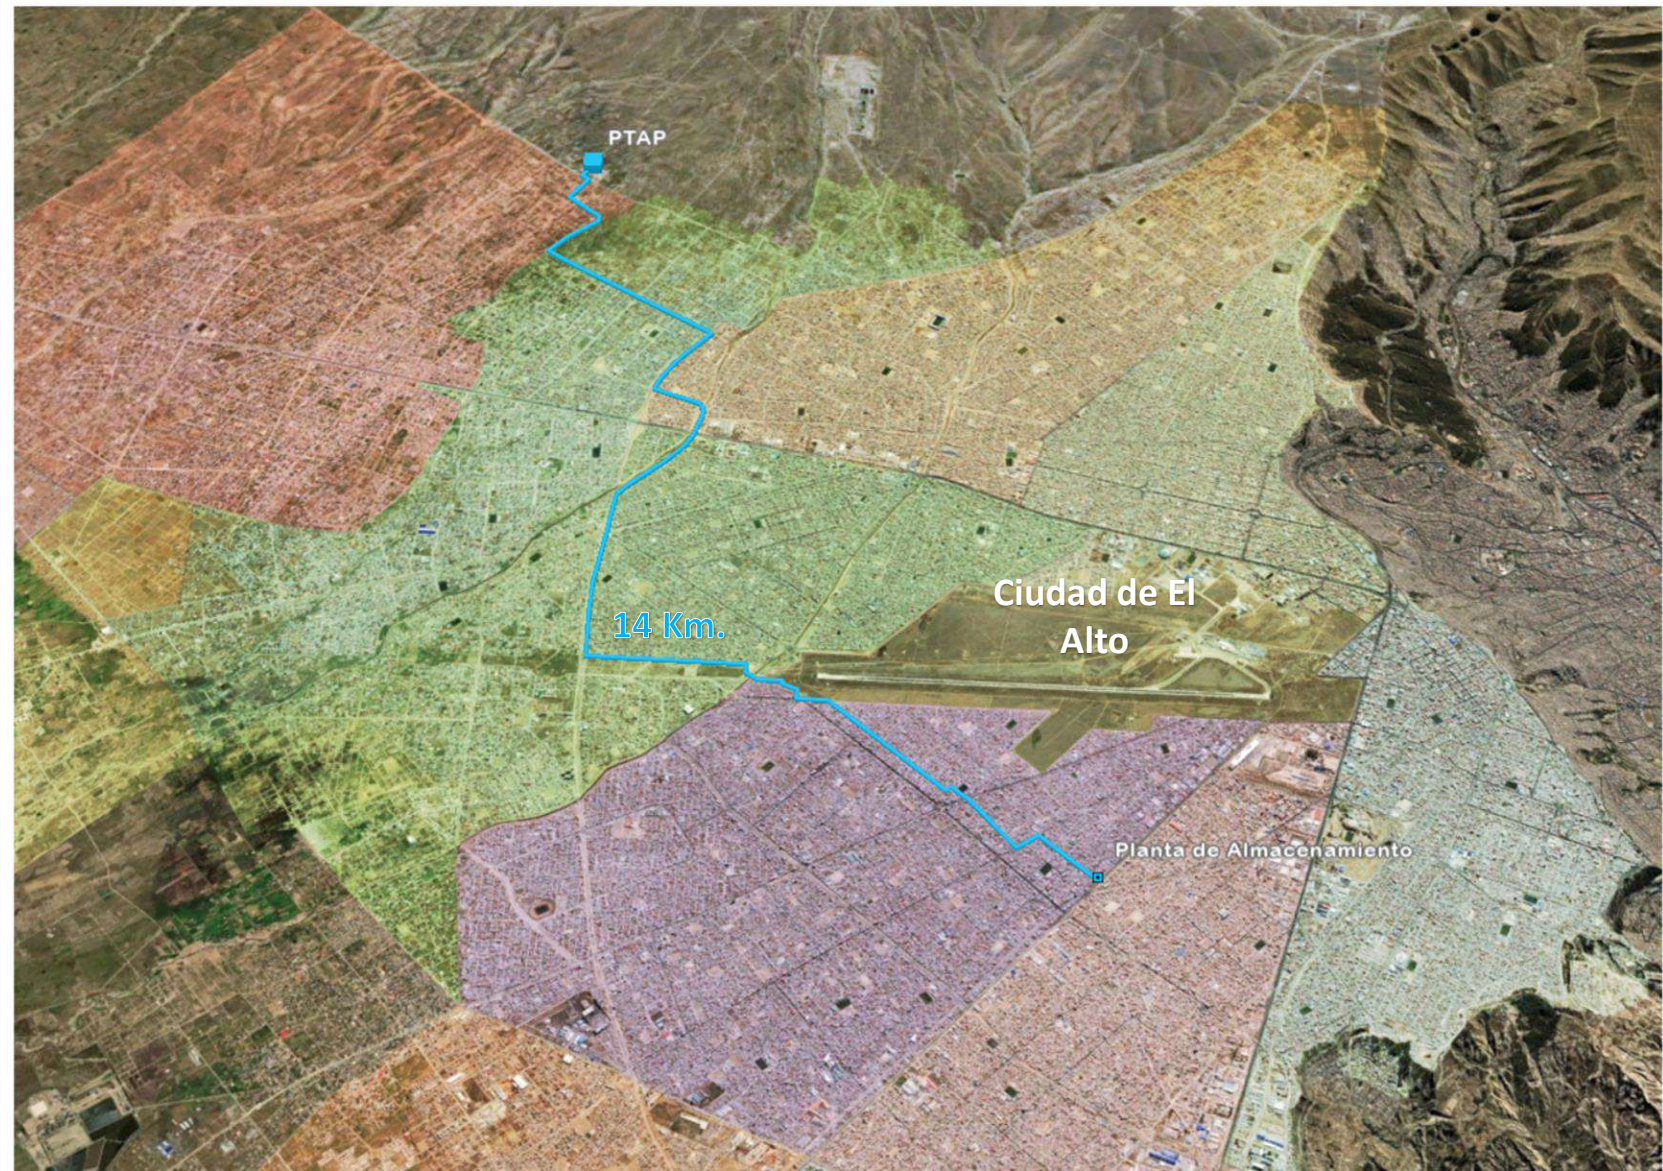

COMPONENTE II: SISTEMAS DE RIEGO

Sistema de Riego Jacha Jahuirá GAM Batallas

N° de comunidades : 28

N° de Familias : 3.066

Ha Bajo Riego 2.727

INVERSION \$us. 24,46 Millones

AVANCE FÍSICO: 92,84 %

AVANCE FINANCIERO: 96,52 %

Sistema de Riego Khullu Cachi GAM Pucarani

N° de comunidades : 28


N° de Familias : 3.422

Ha Bajo Riego 2.837

INVERSION \$us. 26,3 Millones

AVANCE FÍSICO: 93,51 %

AVANCE FINANCIERO: 96,52 %

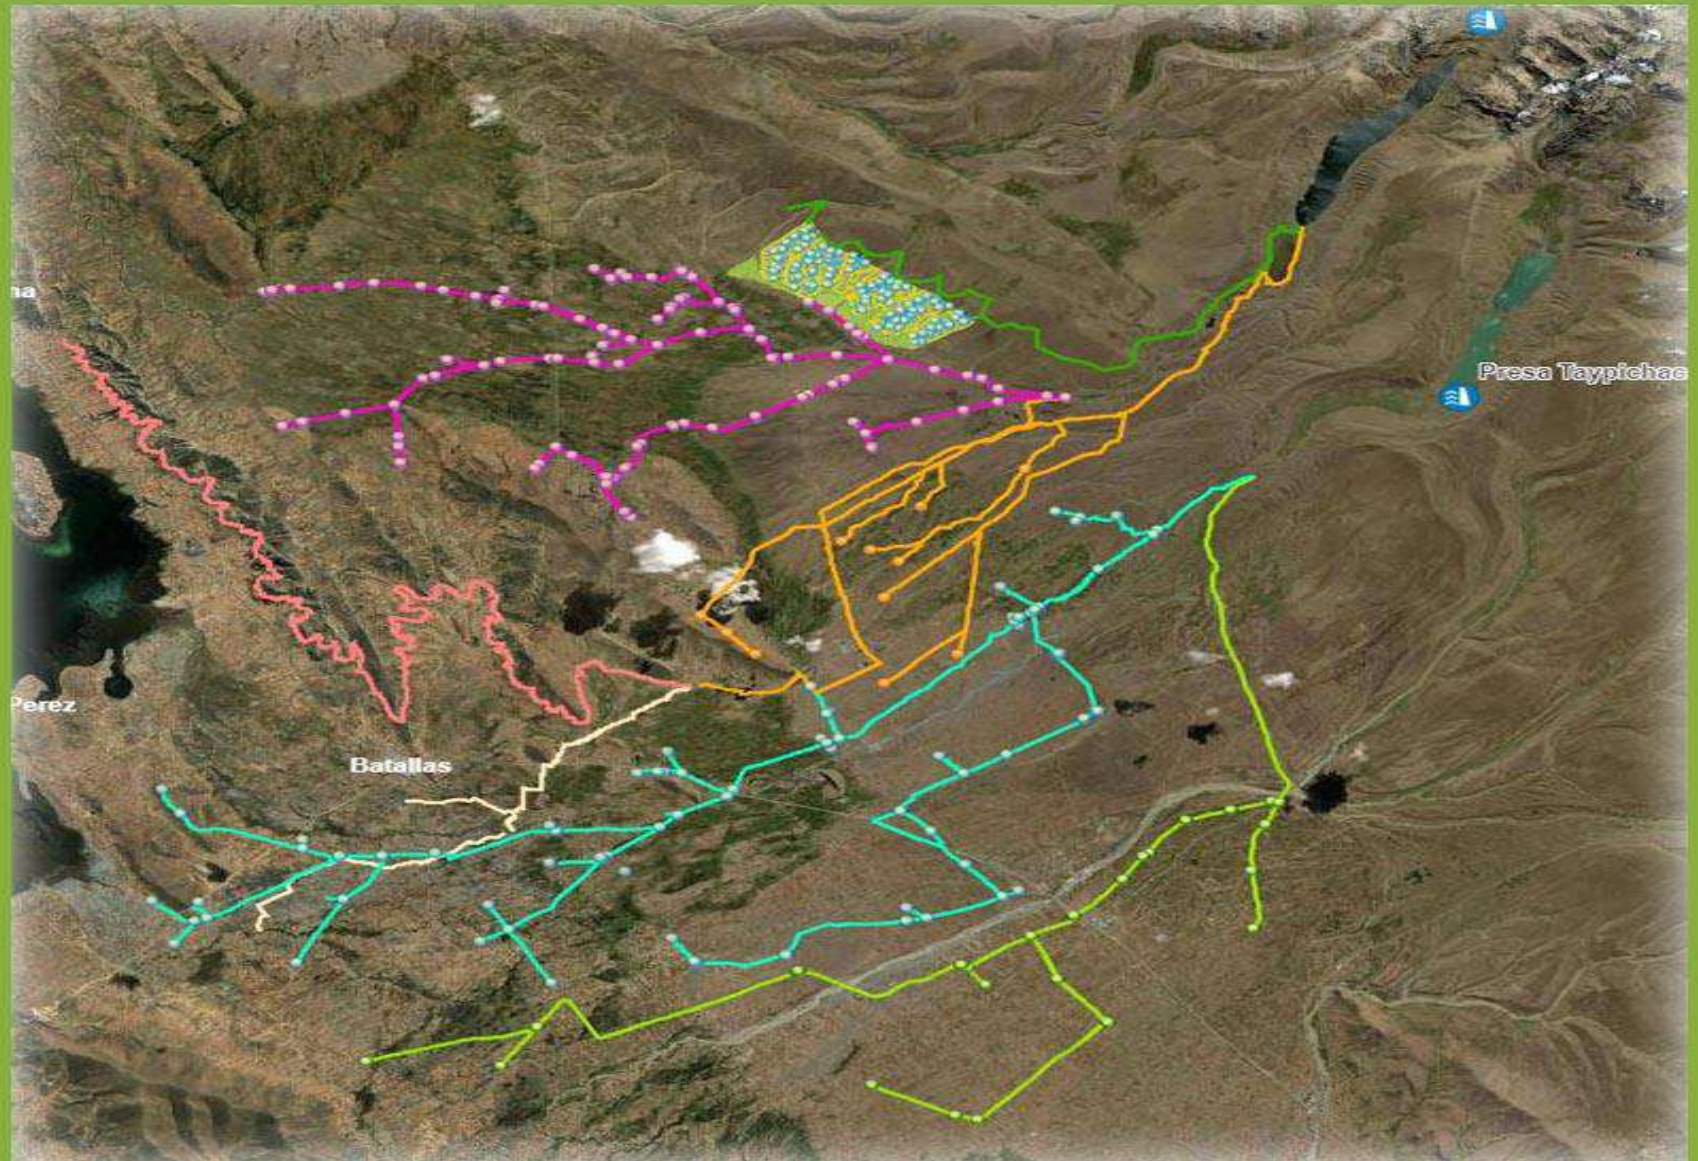

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS

COMPONENTE SOCIAL

PLAN DE
RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO

PROGRAMA DE
EMPENDIMIENTO PARA
MUJERES

PLAN SOCIO
COMUNICACIONAL

PLAN DE GESTION Y
COMPENSACION SOCIAL




FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES
FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS ECONOMICAS PRODUCTIVAS





PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES (PASCIM)

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL MUCHANE (PALOS BLANCOS)


ABRIL 2025

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES - BO L1184 (PASCIM - CP N° 4710/BL-B0)



TOTAL OPERACIÓN
\$us.79.000.000,00



EMAGUA
\$us.76.767.085,00



MMAYa
\$us.2.332.915,00





CONTRAPARTE
(Cuando corresponda)

CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS

TIPO/GASTO	Nro. PROY	MONTO TOTAL (Bs)
INV	115	474.777.200,69
Total INV	115	474.777.200,69
PREINV	28	6.052.928,90
Total PREINV	28	6.052.928,90
Total general	143	480.830.129,59

N
r
o
.
P
R
O
Y

M
O
N
T
O
S
(
B
s
)

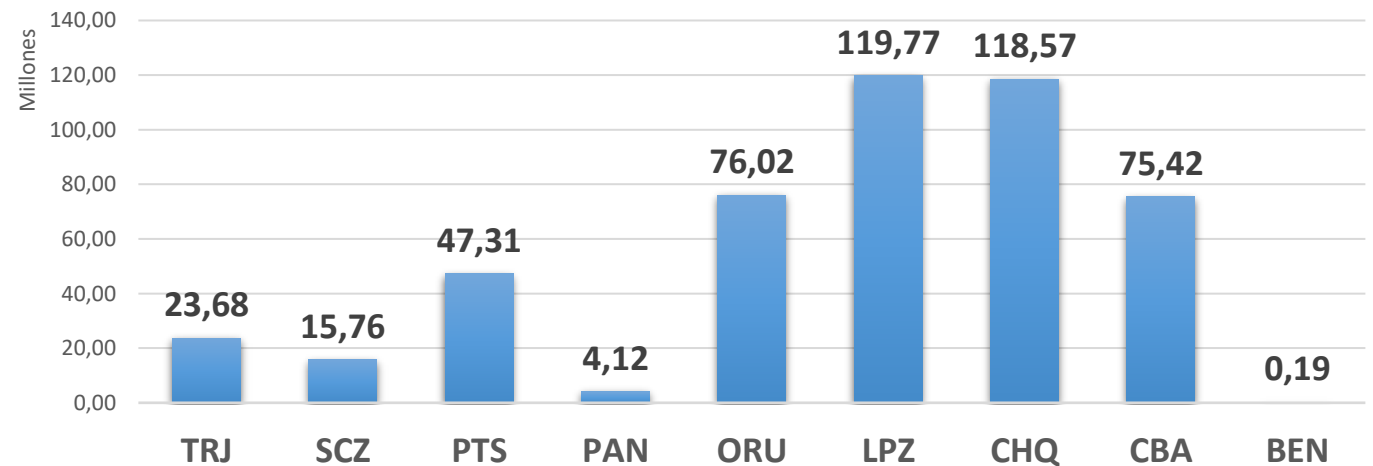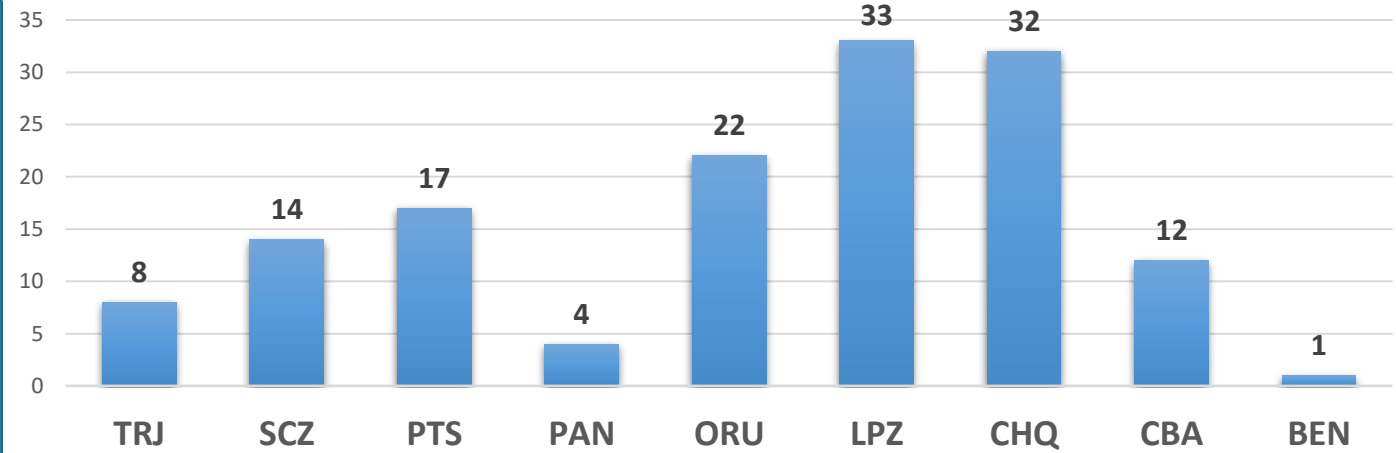


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2025: PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2025 (En Bolivianos)

- ☐ **EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 45 PROYECTOS QUE BENEFICIARÁN A 6.914 FAMILIAS CON UNA INVERSIÓN DE Bs106,5 MM**
- ☐ **INICIAREMOS Y EJECUTAREMOS MAS DE 96 PROYECTOS**

DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL (Bs)	FAMILIAS BENEFICIARIAS
CHUQUISACA	30.878.942	1.736
ORURO	25.924.972	1.347
LA PAZ	20.932.776	2.041
COCHABAMBA	13.525.384	1.133
POTOSÍ	8.725.351	336
TARIJA	3.195.967	105
SANTA CRUZ	2.503.443	169
PANDO	845.502	47
Total general	106.532.336	6.914

PROYECTOS PASCIM EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

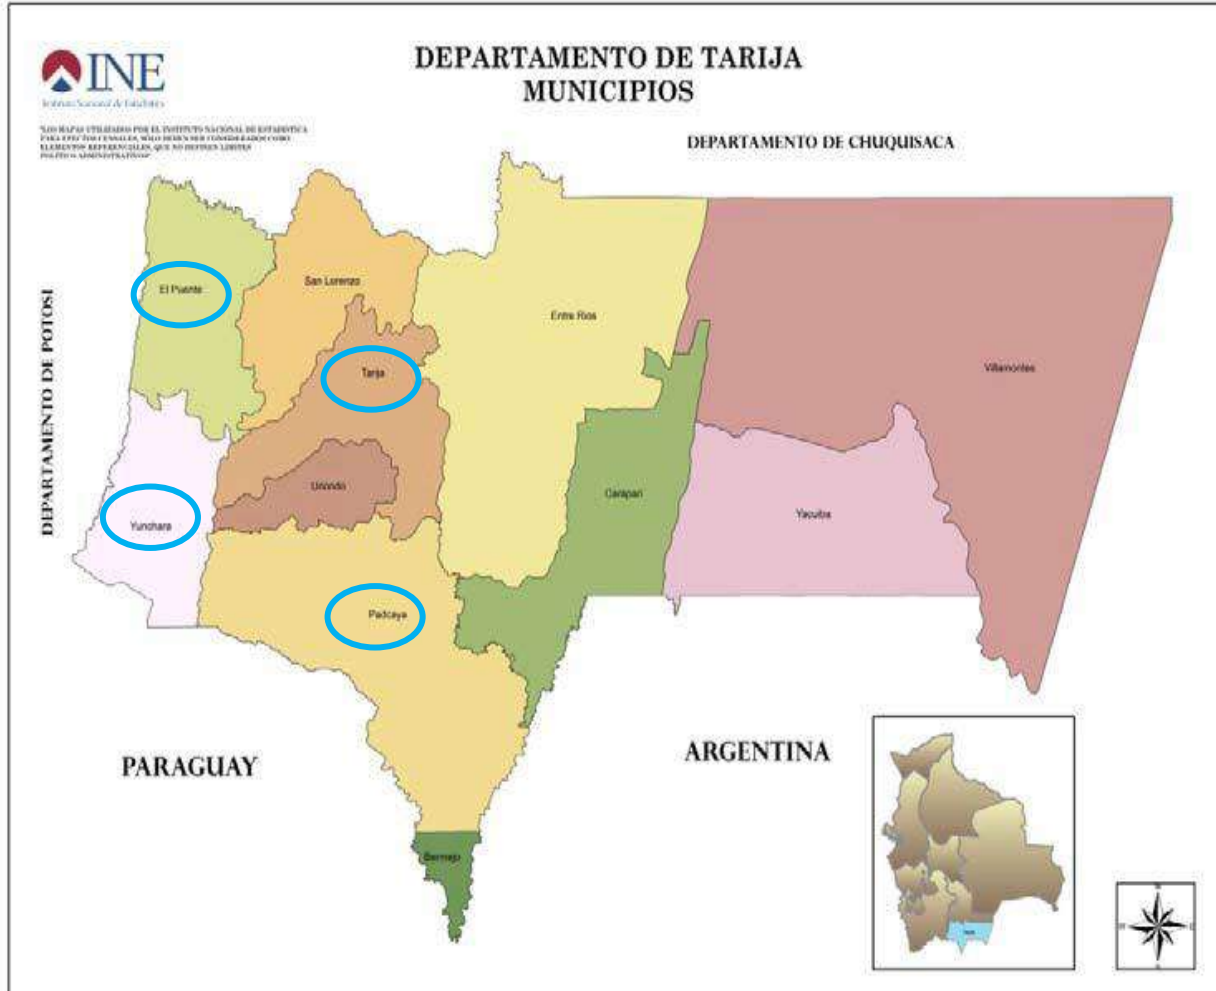


- ☐ SE PRIORIZAN 8 PROYECTOS PARA SER EJECUTADOS EN EL PROGRAMA PASCIM POR UN MONTO DE Bs23,68 MM.
- ☐ EN LA GESTIÓN 2025 SE CONCLUIRÁN 2 PROYECTOS.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL (Bs)
TARIJA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAURELES, ZONA MONTE SUD - CIUDAD DE TARIJA	8.641.514,27 8.641.514,27
TARIJA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CEREZOS, ALTO CATEDRAL - CIUDAD DE TARIJA	3.621.859,27 3.621.859,27
YUNCHARA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PELOC	963.361,27 963.361,27
EL PUENTE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA DE AGUA RICA	2.232.605,52 2.232.605,52
EL PUENTE	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CHORCOYA MENDEZ	4.361.802,25 4.361.802,25
EL PUENTE	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ROQUE - MUNICIPIO EL PUENTE	161.944,60
EL PUENTE	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL MOLINO - MUNICIPIO EL PUENTE	189.196,71
PADCAYA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO CAMACHO	3.509.715,99
		23.681.999,88



PROGRAMA “AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR” (PAPAG)

LOTE 4: CONST. TANQUES DE ALMACENAMIENTO ZONA NORESTE Y ADUCCIONES - TARIJA



ABRIL 2025

PROGRAMA PAPAG – GUADALQUIVIR



TOTAL OPERACIÓN
Bs217 MM



KfW-CRED
Bs27,2



KfW - DON
Bs67,6 MM



CONTRAPARTE
Bs122,2 MM

OBJETIVO: Realizar un trabajo integral para mejorar la situación en el sector de saneamiento básico en las comunidades de Tarija, San Lorenzo, Concepción y Padcaya; contribuyendo a la salud pública y la protección del medio ambiente.

METAS:

- ☐ 184.632 Habitantes (Población beneficiada).
- ☐ 11.740 Nuevas Conexiones de Agua Potable.
- ☐ 858 Conexiones de Saneamiento Básico.



PROYECTOS DEL PROGRAMA PAPAG (10 LOTES) – TOTAL(Bs.) 181,775,248,25

LOTE	NOMBRE DE PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTADO	LOTE	NOMBRE DE PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ESTADO
1	LOTE 1: CONST. SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE "LAS TIPAS"	17.459.879,34	CONCLUIDO (FASE II EN GESTIÓN)	7B	PROVISIÓN VÁLVULAS DE CIERRE Y ACCESORIOS SECTORIZACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TARIJA	119.999,76	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO
2	LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DEL SUB-SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS	22.410.834,28	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO	7C	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LAS VALVULAS DE CIERRE Y ACC. SECTORIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TARIJA	58.711,70	EJECUTADO POR COSAALT R.L.
3	LOTE 3: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TABLADITA Y ALTO SENAC	27.299.048,57	CONCLUIDO	8	LOTE 8: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONCEPCIÓN - URIONDO	7.945.005,00	PARA ORDEN DE PROCEDER
4	LOTE 4: CONST. TANQUES DE ALMACENAMIENTO ZONA NORESTE Y ADUCCIONES - TARIJA	41.337.265,77	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO	9 Y 9A	LOTE 9: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO "PADCAYA" (incluye construcción cámaras)	17.152.597,05	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO
5A	LOTE 5A: Suministro micro-medidores y accesorios	4.199.000,00	EJECUTADO POR COSAALT R.L.	9B (F1 y F2)	LOTE 9B: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PADCAYA" (incluye Fase II)	502.306,32	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO
5B	LOTE 5B: Suministro cajas de FFD	2.530.000,00	EJECUTADO POR COSAALT R.L.	10	LOTE 10: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO "SAN LORENZO"	27.292.519,41	CONCLUIDO Y TRANSFERIDO
5C	LOTE 5C: Instalación de micromedidores	3.582.704,11	EJECUTADO POR COSAALT R.L.	MC-PAPAG EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO PARA LAS EPSA`S (MEDIDA COMPLEMENTARIA	1.377.511,24	CONCLUIDO
7A	LOTE 7a: IMPLEMENTACIÓN SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TARIJA-CAMBIO DE MATRICES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	8.507.865,70	CONCLUIDO				

LOTE 3: DISEÑO Y CONST. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TABLADITA Y ALTO SENAC

DEPARTAMENTO:

TARIJA

MUNICIPIO:

CERCADO

INVERSIÓN TOTAL:

Bs27.299.048,57

PERIODO DE
EJECUCIÓN:

CONCLUIDO 2023

BENEFICIARIOS:

ESTADO:

CONCLUIDO



- **CONCLUIDO, EN OPERACIÓN Y TRANSFERIDO AL GAMT EN LA GESTIÓN 2023**
- **EN PROCESO DE TRANSFERENCIA A COSAALT R.L.**

LOTE 4: CONST. TANQUES DE ALMACENAMIENTO ZONA NORESTE Y ADUCCIONES - TARIJA

DEPARTAMENTO:

TARIJA

MUNICIPIO:

CERCADO

INVERSIÓN TOTAL:

Bs41.337.265,77

PERIODO DE
EJECUCIÓN:

CONCLUIDO 2021

BENEFICIARIOS:

ESTADO:

CONCLUIDO



- **CONCLUIDO, EN OPERACIÓN, TRANSFERIDO AL GAMT EN LA GESTIÓN 2021 Y EN PROCESO DE TRANSFERENCIA A COSAALT.**

LOTE 7A: IMPLEMENTACIÓN SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TARIJA-CAMBIO DE MATRICES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO:

TARIJA

MUNICIPIO:

CERCADO

INVERSIÓN TOTAL:

Bs8.507.865,70


PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONCLUIDO 2022

BENEFICIARIOS:

ESTADO:

CONCLUIDO

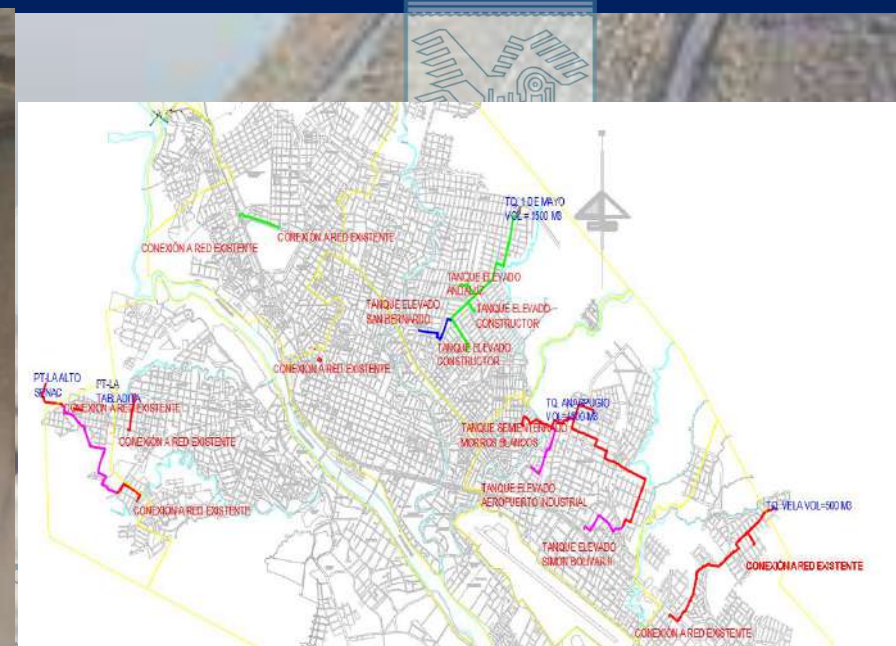


- **CONCLUIDO, EN OPERACIÓN, TRANSFERIDO AL GAMT EN LA GESTIÓN 2022 Y EN PROCESO DE TRANSFERENCIA A COSAALT R.L**



CONST. SISTEMA DE RIEGO TERACOLLO (PUCARANI)

PROYECTOS RELEVANTES – A CONCLUIRSE EN LA GESTIÓN 2025



ABRIL 2025

CONST. SISTEMA DE RIEGO TERACOLLO (PUCARANI)

DEPARTAMENTO:

LA PAZ

MUNICIPIO:

PUCARANI

INVERSIÓN TOTAL:

Bs68.984.344,51

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 18/10/2022

A: 26/2/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 277.-

HA REGADAS: 669.-

ESTADO:

RECEP. PROVISIONAL



CONST. SISTEMA DE RIEGO LA MADERA (TORO TORO)

DEPARTAMENTO:

POTOSÍ

MUNICIPIO:

TORO TORO

INVERSIÓN TOTAL:

Bs17.817.136,49

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 28/06/2023

A: 11/06/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 121.-

HA. REGADAS: 128.-

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. REPRESA ANGOSTURA – COCHABAMBA

DEPARTAMENTO:

COCHABAMBA

MUNICIPIO:

OMEREQUE

INVERSIÓN TOTAL:

Bs140.486.041,65

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 31/05/2021

A: 09/08/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 465.-

HA. REGADAS: 1.400.-

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. PROYECTO DE RIEGO PUCA LOMA

DEPARTAMENTO:

CHUQUISACA

MUNICIPIO:

SAN LUCAS

INVERSIÓN TOTAL:

Bs18.920.604,33

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 01/02/2023

A: 18/06/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 118.-

HA. REGADAS: 143.-

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. RIEGO TECNIFICADO SANKAYANI ALTO Y COCHIMITA

DEPARTAMENTO:

COCHABAMBA

MUNICIPIO:

TIRAQUE

INVERSIÓN TOTAL:

Bs17.300.180,27

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 29/08/2023

A: 26/09/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 356.-

HA. REGADAS: 201.-

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAHUACHACA (SICA SICA)

DEPARTAMENTO:

LA PAZ

MUNICIPIO:

SICA SICA

INVERSIÓN TOTAL:

Bs16.724.571,30

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 22/05/2023

A: 21/04/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 2.087.-

CONEXIONES: 2087

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. EMBOVEDADO CANAL TAGARETE FASE I, ORURO (PROASRED)

DEPARTAMENTO:

ORURO

MUNICIPIO:

ORURO

INVERSIÓN TOTAL:

Bs 21.030.656,70

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 28/11/2023

A: 30/06/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS: 5.000.-

ESTADO:

TRAMO II

EN EJECUCIÓN





FIRMA DE CONVENIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

PROGRAMA PASCIM – PROYECTOS A CONCLUIRSE EN LA GESTIÓN 2025

ABRIL 2025

CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COLPANAYOC

DEPARTAMENTO:

CHUQUISACA

MUNICIPIO:

CAMATAQUI (V.A)

INVERSIÓN TOTAL:

Bs1.434.756,18

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 30/08/2024

A: 15/08/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS:

CONEXIONES: 61

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR POROMA

DEPARTAMENTO:

CHUQUISACA

MUNICIPIO:

POROMA

INVERSIÓN TOTAL:

Bs7.304.088,92

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 23/12/2024

A: 18/09/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS:

CONEXIONES: 440

ESTADO:

EN EJECUCIÓN



CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHALLACOTA (S. GARCI MENDOZA)

DEPARTAMENTO:

ORURO

MUNICIPIO:

SALINAS

INVERSIÓN TOTAL:

Bs3.333.206,79

PERIODO DE

EJECUCIÓN:

DE: 23/12/2024

A: 19/08/2025

BENEFICIARIOS:

FAMILIAS:

CONEXIONES: 103

ESTADO:

EN EJECUCIÓN




5. GRANDES PROYECTOS EN OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO – GESTIÓN 2025

CONSTRUCCIÓN PROYECTO MÚLTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ

ABRIL 2025

CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIOS (PTAR) VIACHA - LA PAZ (PROASRED) Bs. 31,20 MM

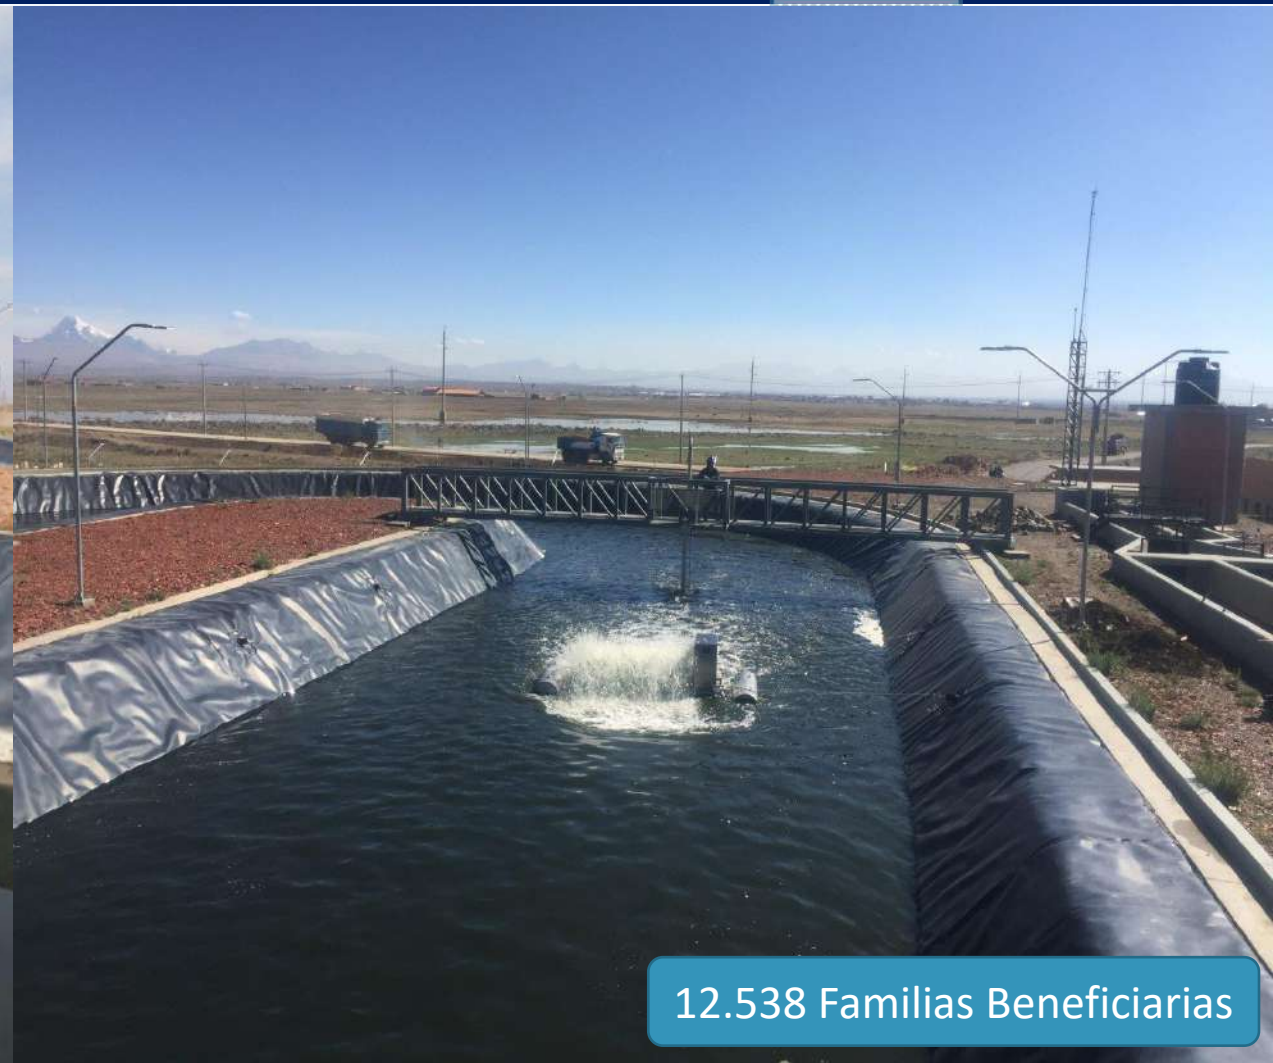

12.538 Familias Beneficiarias

AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED) Bs. 60,6 MM




2.494 Familias Beneficiarias

CONSTRUCCIÓN PROYECTO MÚLTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA (PROAR) Bs. 75,3 MM



CONST. SISTEMA DE RIEGO CABILDO HILCHACO (TINGUIPAYA – POTOSI) – PROGRAMA PRESAS Bs. 27,35 MM

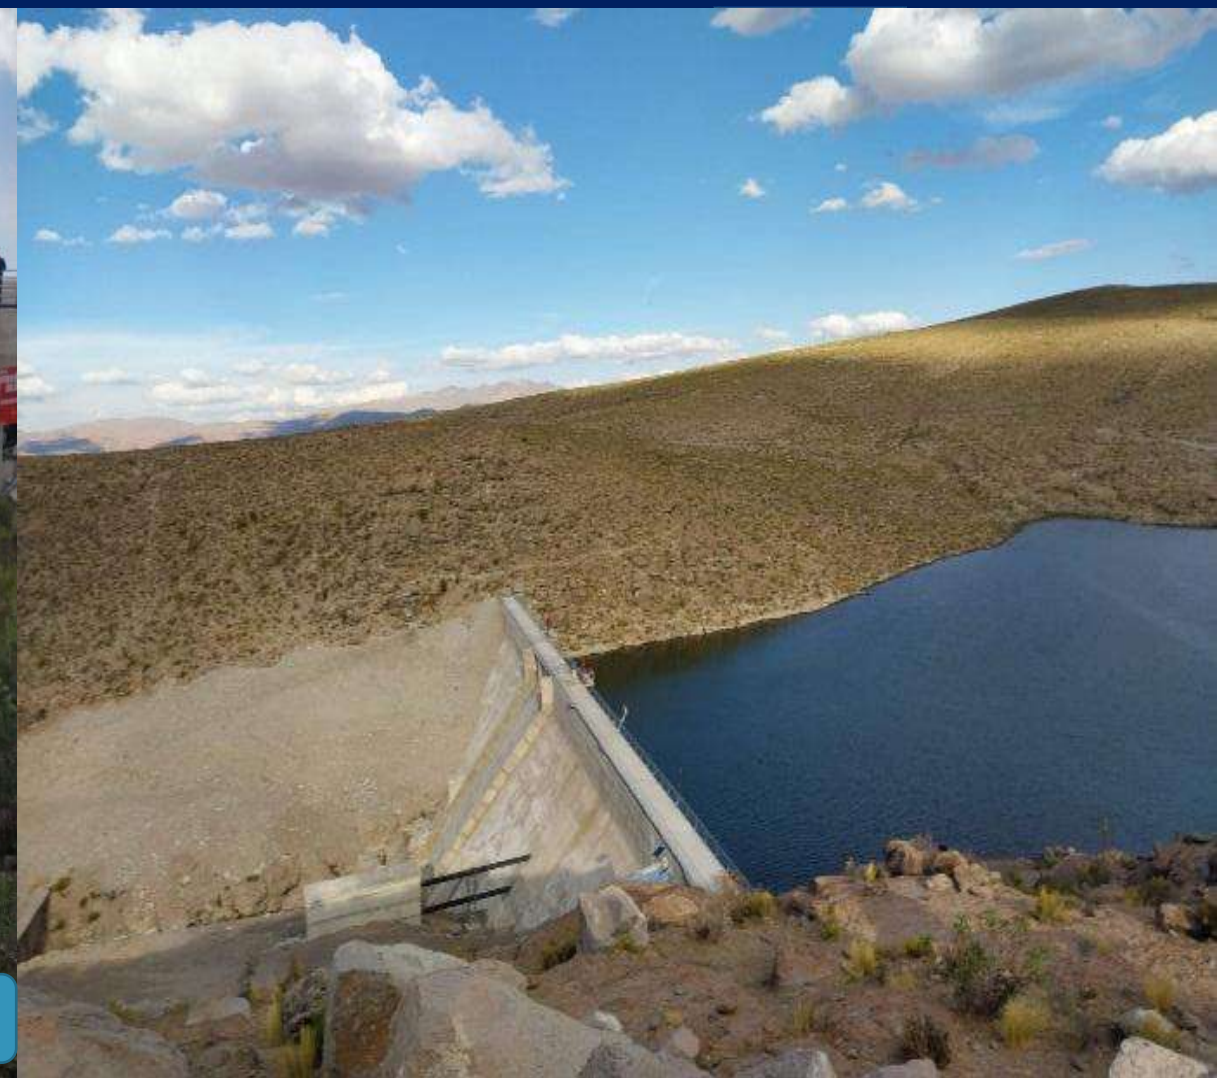

CONST. PRESA Y SIST. DE RIEGO VALLES TARABUCO MIC – CHUQUISACA Bs85,7 MM



CONST. SISTEMA DE RIEGO ANFAYA DEL PERAL (YOTALA – CHUQUISACA) Bs35,7 MM



CONST. PRESA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO KULLCU (ORURO - SOROCACHI) Bs23,7



165 HECTÁREAS REGADAS

AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO (CERCADO - COCHABAMBA) Bs102,7 MM





6. CONCLUSIONES GESTIÓN 2025

CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIOS (PTAR) VIACHA - LA PAZ (PROASRED)


ABRIL 2025

CONCLUSIONES: GESTIÓN 2025

- ✓ **EMAGUA**: AL 31 DE MARZO DEL 2025, HEMOS CONSOLIDADO UNA EJECUCIÓN DEL 26,53% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- ✓ **EMAGUA**: EN LA GESTIÓN 2025 EJECUTAREMOS 214 PROYECTOS.
- ✓ **EMAGUA**: CONSOLIDAREMOS UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE Bs332,7 MM. (136% RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y EL 80% RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE PROYECTADO).
- ✓ **EMAGUA**: EN LA GESTIÓN 2025: INICIAREMOS 97 PROYECTOS y CONCLUIREMOS 74 PROYECTOS.
- ✓ **PRESAS**: EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 7 PRESAS, QUE BENEFICIARÁN A 3.351 FAMILIAS E INCREMENTARÁN 4.979 HECTÁREAS BAJO RIEGO CON UNA INVERSIÓN DE Bs465,1MM

CONCLUSIONES: GESTIÓN 2025

- ✓ MULTIPROPÓSITO: EN EL MARCO DE LAS CONDICIONES FAVORABLES, CONCLUIREMOS EL PROGRAMA MULTIPROPÓSITO QUE BENEFICIARÁ A MAS DE 1 MILLON DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, PUCARANI Y BATALLAS.
- ✓ PASCIM: EN LA GESTIÓN 2025 CONCLUIREMOS 45 PROYECTOS QUE BENEFICIARÁN A 6.914 FAMILIAS CON UNA INVERSIÓN DE Bs106,5 MM.
- ✓ PASCIM: INICIAREMOS Y EJECUTAREMOS MAS DE 96 PROYECTOS
- ✓ PERIURBANOS I SANTA CRUZ: REACTIVAREMOS LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

EMAGUA IMPLEMENTA UNA GESTIÓN POR RESULTADOS.

“EMAGUA LA ENTIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTE EN EL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA”

An aerial photograph of a large-scale construction project, likely a dam or reservoir. A large, irregularly shaped pond of greyish water is the central feature. To its right, a long, straight dam structure extends towards the top right corner. The surrounding landscape is dry and hilly, with some construction equipment and materials visible on the ground. In the bottom left, there's a small cluster of buildings with colorful roofs.

PREGUNTAS...



EMAGUA
Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua



GRACIAS...



EMAGUA
Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua
